

مشاريع المستوى الوطني

أبرز المشاريع الرأسمالية على المستوى الوطني

(بالآلاف دينار)

الرقم	اسم المشروع	الجهة المنفذة	مخصصات ٢٠٠٨	نسبة الإنفاق %	نسبة الإنجاز %	الملاحظات
	مجموع المشاريع الرأسمالية على المستوى الوطني منها المشاريع التالية		٧٠٤١٥٠.٥	٨٥.٥	-	
١.	نقل مياه الديسي لعمان/دراسات	وزارة المياه والري	٩٨٠	٩٤	N.A	المشروع يسير حسب البرنامج الزمني المعدل.
٢.	دراسة استكشاف الطبقات العميقة.	وزارة المياه والري	٤٧٠	٨٩	١٠٠	تم الانتهاء من حفر بئر استكشافي واحد خلال عام ٢٠٠٨
٣.	إنشاءات مختلفة وإضافات غرف صفية.	وزارة التربية	١١٤١	٩٩.٨	٨٠	المشروع يسير حسب المخطط له.
٤.	تطوير ربط المدارس إلكترونياً.	وزارة التربية	١٦٤٤	٣٤.٦	٤٠	المشروع يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات.
٥.	توسعة وتحديث أقسام الطوارئ في (١٠) مستشفيات قائمة.	وزارة الصحة	٢٩٠	٩٦.٥	٨٢	تم إنجاز (٨) أقسام طوارئ وتم استلامها.
٦.	مستشفى السكري والغدد الصماء.	وزارة الصحة	٢٠٠٠	١٠٠	١٠٠	تم تحويل (٢٠٠٠) ألف دينار لغاية ٢٠٠٨/١٢/٣١.
٧.	إنشاء (٣) مديريات تنمية اجتماعية.	وزارة التنمية الإجتماعية	٢٥٠	-	١٠	المشروع يسير دون المستوى المخطط له.
٨.	إنشاء مبنى جديد لوزارة النقل.	وزارة النقل	٤٦٥	١٠.٦	١٠	المشروع يسير دون المستوى المخطط له بسبب التأخر في طرح وإحالة العطاء.
٩.	إنشاء مبنى مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني.	وزارة الاتصالات	٢٠٠	٥	-	المشروع في طور الانتهاء من الدراسات وإعداد التصاميم.
١٠.	إنشاء مبنى ديوان الخدمة المدنية.	ديوان الخدمة المدنية	١٤٠٠	٩٥	١٥	العمل جارٍ في موقع المشروع.

١١.	إكمال إنشاء مبنى مديرية الجنسية وشؤون الأجانب.	وزارة الداخلية	١٥٠	١٠٠	١٠٠	تم الانتهاء من المشروع وتم استلامه أولياً.
١٢.	تطوير وتحديث الأبنية/ الأمن العام.	مديرية الأمن العام	١٠٤٥٠	١٠٠	١٠٠	تم إنجاز مبنى القيادة والسيطرة والعمل مستمر في إنجاز مبنى مديريةية الأمن العام.

(بالألف دينار)

الرقم	اسم المشروع	الجهة المنفذة	مخصصات ٢٠٠٨ ت	نسبة الإنفاق %	نسبة الإنجاز %	الملاحظات
١٣.	تحديث الأبنية / وزارة الداخلية / الأمن العام.	مديرية الأمن العام	١١٠٠	١٠٠	١٠٠	تم الانتهاء من تحديث الأبنية لعام ٢٠٠٨.
١٤.	إنشاء مبنى دار القضاء العالي.	وزارة العدل	-	-	-	المشروع في مرحلة الدراسات وإعداد التصاميم وتم إجراء مناقلات بكامل المخصص.
١٥.	إنشاء مبنى محكمة الجنايات الكبرى.	وزارة العدل	٢٨٠٠	٥٨	٢٠	العمل جارٍ في موقع المشروع.
١٦.	إنشاء مبنى المعهد القضائي.	وزارة العدل	-	-	-	يتم السير في إجراءات المشروع عند تحديد موقع المدينة القضائية وتنفيذها وتم إجراء مناقلات بكامل المخصص.
١٧.	مبنى دائرة قاضي القضاة.	دائرة قاضي القضاة	٩٠٠	٣٣	١٠	العمل جارٍ في موقع المشروع.
١٨.	استملاك أراضي لمخيم الحسين ومخيم مادبا.	الشؤون الفلسطينية	١٤١٥	-	-	هناك اعتراضات من أصحاب قطع الأراضي على القيمة المقدرة للأرض من قبل اللجان المختصة.
١٩.	البرنامج الوطني لإنشاء المباني الحكومية.	وزارة المالية	١٥٠٠٠	٨٧	٨٥	المشروع يسير حسب المخطط له.
٢٠.	المجلس الأعلى لشؤون المعوقين.	وزارة المالية	٤٥٠٠	٥٠	-	المشروع هو دعم من الخزينة للنفقات الرأسمالية للمجلس.
٢١.	تأهيل مكاتب النفديات.	وزارة الشؤون البلدية	١٦٢٥	١١٣	١٠٠	المشروع يسير حسب المخطط له.

٢٢.	مكافحة الفقر من خلال التنمية المحلية.	وزارة الشؤون البلدية	٥٠٠٠	١١٠	١٠٠	المشروع يسير حسب المخطط له.
٢٣.	محطة توليد الكهرباء الثاني/المنار.	وزارة الطاقة	٨٥٠	٣٧.٥	١٠٠	المشروع يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات.
٢٤.	استغلال طاقة الرياح لتوليد الكهرباء (الحرير، الطفيلة).	وزارة الطاقة	١٠٠٠	٤٢.٥	-	تم تعرض البرج القياسي للسرقة مما أدى إلى تأخير في تنفيذ المشروع حيث تم تدوير المبلغ في حساب الأمانات / وزارة المالية
٢٥.	تأسيس صندوق كفاءة الطاقة.	وزارة الطاقة	٧٥٠	١٠٠	-	يتم تأسيس صندوق كفاءة الطاقة بعد إقرار قانون الطاقة المتجددة والآن القانون في مراحل الدستورية وتم تدوير المبلغ في حساب الأمانات / وزارة المالية

(بالألف دينار)

الرقم	اسم المشروع	الجهة المنفذة	مخصصات ٢٠٠٨	نسبة الإنفاق %	نسبة الإنجاز %	الملاحظات
٢٦.	مشروع اليورانيوم.	سلطة المصادر الطبيعية	٤٧	-	-	تم تحويل المشروع إلى هيئة الطاقة الذرية.
٢٧.	تحديث مرصد الزلازل.	سلطة المصادر الطبيعية	٥٩٠	١٠٠	-	تم طرح العطاء وإحالته في شهر كانون الأول ٢٠٠٨.
٢٨.	التنقيب عن البترول من خلال تسويق المناطق الاستكشافية.	سلطة المصادر الطبيعية	٨٣٥	٥٦.٦	١٠٠	المشروع يسير حسب المخطط له.
٢٩.	صيانة وتأهيل المبنى الجديد/دائرة مراقبة الشركات.	وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات	٢٥٠	-	-	تم طرح العطاء وإحالته من المتوقع المباشرة بالتنفيذ خلال شهر كانون الثاني ٢٠٠٩.
٣٠.	حزمة الأمان الاجتماعي.	وزارة التخطيط	٣٧٩٠	٩٤.٥	٧٥	المشروع يسير حسب المخطط له.
٣١.	تطوير السياحة الثالث.	وزارة التخطيط	٢٤٩٥	١٠٠	١٨	المشروع يسير حسب المخطط له.
٣٢.	تطوير القطاع السياحي.	وزارة التخطيط	٢٦١١	٩٩.٧	٨٤	المشروع يسير حسب المخطط له.

٣٣.	بناء (٢٥) مدرسة أساسية.	وزارة التخطيط	١٤٣٦	٩٨.٧	٧٠	المشروع يسير حسب المخطط له.
٣٤.	إنشاء صندوق التراث.	وزارة السياحة والآثار/السياحة	٣٠٠	١٠٠	١٠٠	المشروع يسير حسب المخطط له.
٣٥.	إنشاء شركة إدارة وتطوير المواقع السياحية.	وزارة السياحة والآثار/السياحة	٥٠٠	-	-	بانتظار الموافقة النهائية من دولة رئيس الوزراء لتأسيس الشركة.
٣٦.	المتحف الوطني.	دائرة الآثار العامة	٦٥٠	٨٩	٦٨	المشروع يسير حسب المخطط له.
٣٧.	التنمية الإقليمية والمحلية.	وزارة الشؤون البلدية	١٨٠٠	١٨	٣٥	تم طرح العطاء وإحالته في شهر آب ٢٠٠٨.

خلاصة المشاريع (الرأسمالية) المرصودة على المستوى الوطني


مخصصات النفقات الرأسمالية للمشاريع التنموية في قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٠٨

قدرت النفقات الرأسمالية للمشاريع التنموية على المستوى الوطني بمبلغ (٧٠٤١٥٠.٥) ألف دينار موزعة على مختلف القطاعات وحسب الفصول للوزارات والدوائر الحكومية أنفق منها (٦٠٢٠٩٧.٨) ألف دينار أي ما نسبته (٨٥.٥%) لغاية ٢٠٠٨/١٢/٣١ وترصد هذه المشاريع في مراكز الوزارات والدوائر الحكومية .


(بالآلاف دينار)

البيان	مقدر ٢٠٠٨	الانفاق حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١	نسبة الانفاق الفعلي %
المشاريع - النفقات (الرأسمالية)	٧٠٤١٥٠.٥	٦٠٢٠٩٧.٨	٨٥.٥

مقارنة الانفاق الفعلي للمشاريع الرأسمالية على المستوى الوطني حسب القطاعات

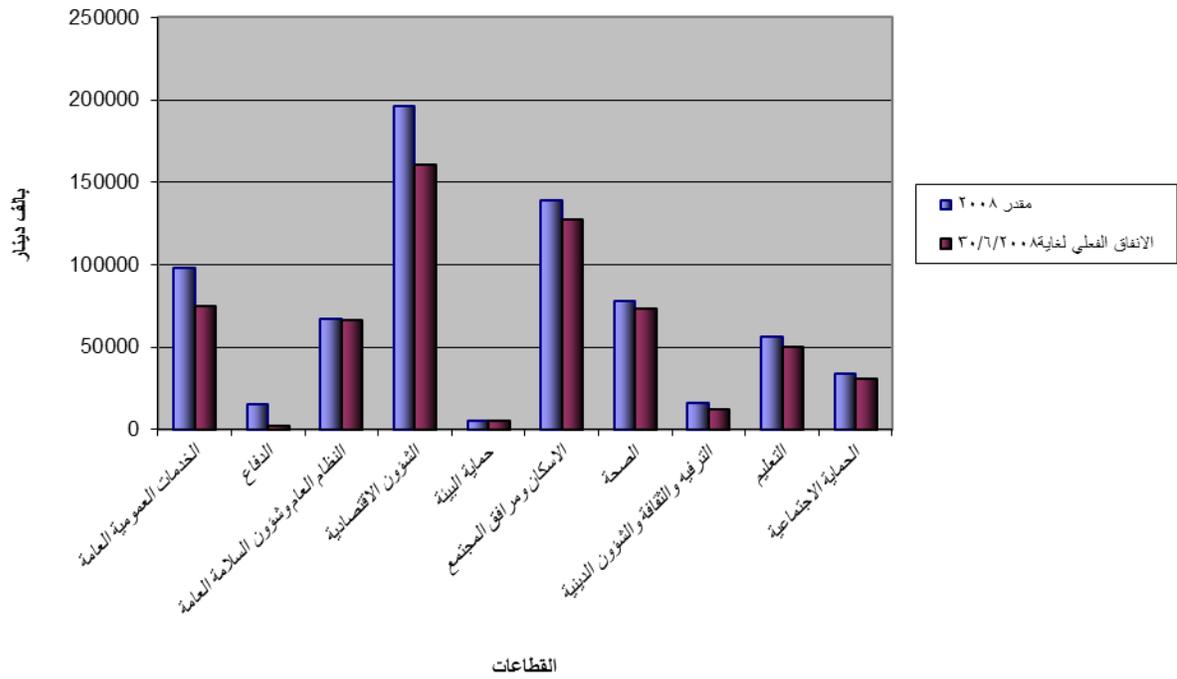

مقارنة المخصصات المالية بموازنة عام 2008 متضمنة المركز الوطني المحافظات

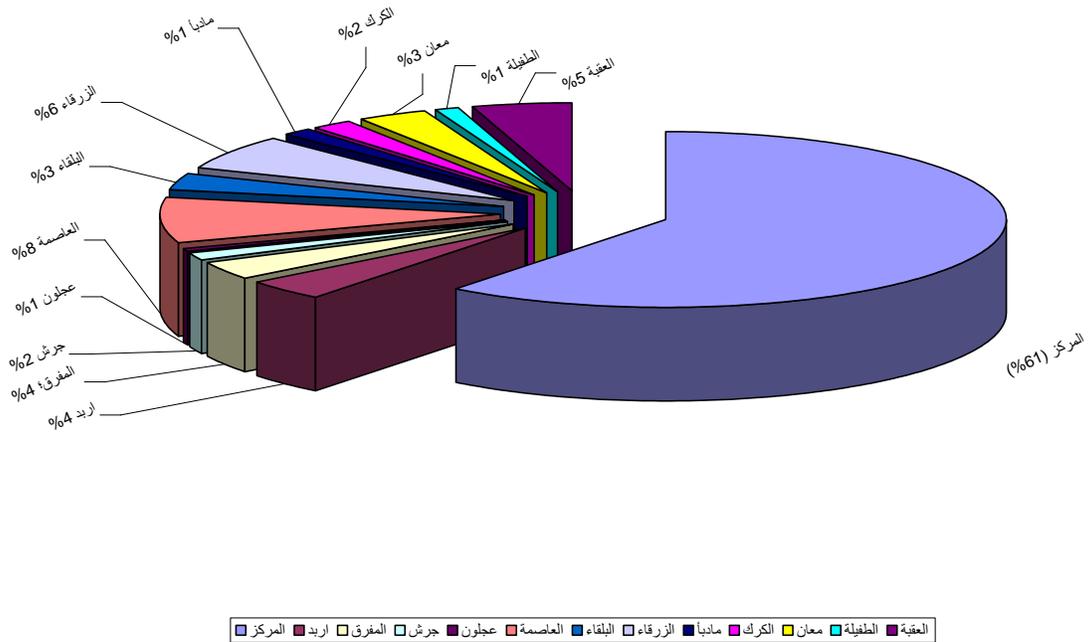

وزارة المالية :-

احتلت وزارة المالية المرتبة الاولى من حيث حجم المخصصات المرصودة على المستوى الوطني حيث تم تخصيص مبلغ (١٧٩٢٣١) الف دينار مشكل ما نسبته ٢٥.٥% من اجمالي المخصصات المرصودة للمركز حيث تم انفاق (١٣٤٦٣٤.٥) الف دينار اي ما نسبته (٧٥%) من المخصصات المرصودة للوزارة حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ .

وزارة التخطيط والتعاون الدولي/المجلس القومي للتخطيط:-

احتلت وزارة وزارة التخطيط والتعاون الدولي/المجلس القومي للتخطيط المرتبة الثانية من حيث حجم المخصصات المرصودة على المستوى الوطني حيث تم تخصيص (٥٧٧٢٢.٧) الف دينار مشكل ما نسبته (٨.٢%) من اجمالي المخصصات المرصودة على المستوى الوطني وتم انفاق (٥٦٢٣٠.٩) الف دينار اي ما نسبته (٩٧.٤%) من المخصصات المرصودة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ .

وزارة الصحة :-

تم تخصيص مبلغ (٥١٩٧٣.٥) الف دينار لوزارة الصحة على المستوى الوطني مشكله ما نسبته (٧.٤%) من اجمالي المخصصات المرصودة على المستوى الوطني حيث تم انفاق (٤٧٤٩٧.٧) الف دينار اي ما نسبته (٩١.٤%) من المخصصات المرصودة للوزارة حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ .

وزارة الاشغال العامة والاسكان:-

تم تخصيص مبلغ (٥٧١٧١.٨) الف دينار لوزارة الاشغال العامة والاسكان على المستوى الوطني مشكله ما نسبته (٨%) من اجمالي المخصصات المرصودة على المستوى الوطني وتم انفاق (٥٨٠٧٨.٧) الف دينار اي ما نسبته (١٠.٢%) من المخصصات المرصودة لوزارة الاشغال العامة والاسكان حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ .

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات :-

تم تخصيص مبلغ (٣٣٠٠٠) الف دينار لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى الوطني مشكل ما نسبته ٤.٧% من اجمالي المخصصات المرصودة على المستوى

الوطني حيث تم انفاق (١٩٧٦٤.٣) الف دينار اي ما نسبته (٦٠%) من المخصصات المرصودة للوزارة حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ .

وزارة التربية والتعليم :-

تم تخصيص مبلغ (٢٧٨٧٤.٦) الف دينار لوزارة التربية والتعليم على المستوى الوطني مشكل ما نسبته ٤% من اجمالي المخصصات المرصودة حيث تم انفاق (٢٥١٢٣.٩) الف دينار اي ما نسبته (٩٠%) من المخصصات المرصودة للوزارة حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ .

وزارة الزراعة :-

تم تخصيص مبلغ (١٤٥٢٣.٥) الف دينار لوزارة الزراعة مشكل ما نسبته (٢%) من اجمالي المخصصات المرصودة على المستوى الوطني حيث تم انفاق (١٤٠٩٦.٥) الف دينار اي ما نسبته (٩٧%) من المخصصات المرصودة للوزارة حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ .

وزارة الطاقة والثروة المعدنية :-

تم تخصيص مبلغ (١١١٧٥) الف دينار لوزارة الطاقة والثروة المعدنية على المستوى الوطني مشكل ما نسبته (١.٦%) من اجمالي المخصصات المرصودة للمركز حيث تم انفاق (٦٥٠٤.٧) الف دينار اي ما نسبته (٥٨.٢%) من المخصصات المرصودة للوزارة حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ .

وزارة التنمية الاجتماعية :-

تم تخصيص مبلغ (١٠٢٤١) الف دينار لوزارة التنمية الاجتماعية على المستوى الوطني مشكل ما نسبته (١.٥%) من اجمالي المخصصات المرصودة للمركز حيث تم انفاق (٩٨١٠) الف دينار اي ما نسبته (٩٥.٨%) من المخصصات المرصودة للوزارة حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ .

وزارة العدل :-

تم تخصيص مبلغ (٨٠٨٢.٥) الف دينار لوزارة العدل على المستوى الوطني مشكل ما نسبته ١.١٤% من اجمالي المخصصات المرصودة للمركز حيث تم انفاق (٦٧٦٤.٩) الف دينار اي ما نسبته (٨٣.٧%) من المخصصات المرصودة للوزارة حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ .

وفيما يلي تقرير مفصل عن أهم المشاريع التي تم تقييمها :-

بالآلف دينار

١ - مشروع نقل مياه الديسي لعمان	
٧٠٢٠٠٠ ٧٢ شهراً ٩٨٠ مرصودة في موازنة وزارة المياه والري / دراسات ٣٥٥٠٠٠ مرصودة ضمن موازنة وزارة المالية ٩٢٠ ٩٤% (دراسات لعام ٢٠٠٨) ٩٠% (دراسات) تم طرح العطاء وإحالته على شركة جاما إنيرجي التركية من خلال نظام الـ BOT وعلى عمق ٥٠٠ متر يتم حفر (٥٥) بئر في منطقة الديسي فيما يستهلك ما يقدر (٢٥٠) ألف طن من الحديد - - المشروع يسير حسب البرنامج الزمني المعدل سيتم بعد الإنتهاء من تصميم المخططات والتصاميم اللازمة للمشروع إلى المباشرة بأعمال الحفر ومد الخطوط الناقلة للمياه بداية شهر آذار ٢٠٠٩	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨ : سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع
-	ملاحظات

بالآلف دينار

٢ - مشروع دراسة إستكشاف الطبقات العميقة	
٥٠٠ (سنوي) مستمر ٤٧٠ ٤١٨ ٨٩% ٦٠% تم الإنتهاء من حفر بئر إستكشافي بدلاً من حفر بئرين حسب خطة الوزارة لعام ٢٠٠٨ - ١٠٠% كان هناك بطء في تنفيذ المشروع بسبب إعطاء الأولوية للمشاريع الإستكشافية في منطقة الجفر / مكرمة ملكية (١٥) بئر إستكشافي	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨ : سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع
مشروع سنوي يهدف إلى إيجاد مصادر مائية إضافية لأغراض الشرب من خلال حفر بئرين وسط المملكة يصل عمق البئر إلى حوالي (١٠٠٠) متر .	ملاحظات

بالآلف دينار

٣- مشروع إنشاءات مختلفة وإضافات غرف صفية	
٤٥٣٠ لكافة المحافظات (سنوي) مستمر ٤٥٣٠ لكافة المحافظات منها ١١٤١ للمركز ١١٣٨ ٩٩.٨% ٩٧%	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع
- تم استخدام ١٥ وحدة سكنية (مدارس ، إضافات غرف صفية ، سكن وظيفي) في البادية الوسطى وعمان . - مدرسة دابوق / إناث - تم توقيف المشروع - مدرسة حسبان حي المراهفة - تم إستلامها أولاً - مدرسة أم العساكر / قيد الإستلام الأولي - مدرسة العبدلية / تم إستلامها أولاً - ١٥% مدرسة دابوق / العاصمة - إعادة دراسة للمشروع ١٠٠% مدرسة حسبان حي المراهفة ١٠٠% مدرسة أم العساكر / المختلطة ١٠٠% مدرسة العبدلية / إناث المشروع يسير حسب المخطط ولكن تم توقيف مشروع مدرسة دابوق لمخالفات مع المتعهد	الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع
مشروع سنوي لبناء غرف صفية للمدارس القائمة لإستيعاب النمو باعداد الطلبة وعمل إنشاءات متنوعة لهذه المدارس وإنشاء سكن وظيفي للمعلمين في المناطق النائية	ملاحظات

بالآلف دينار

٤- مشروع تطوير ربط المدارس إلكترونياً	
٩٠٠ سنوي مستمر ١٦٤٤ (لكافة المحافظات) ٥٦٩ ٣٤.٦% ٣٥%	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع
مشروع سنوي لربط المدارس إلكترونياً بشبكة الإنترنت لتسهيل عملية التعليم ونقل المعرفة لكافة المدارس -	الأوامر التغييرية

نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع	٤٠% يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات
ملاحظات	-

بالآلف دينار

٥- مشروع توسعة وتحديث أقسام الطوارئ في ١٠ مستشفيات قائمة	
<p>١٥٠٠ ٣٦ شهراً ٢٩٠ ٢٨٠ ٩٦.٥% ٩٠%</p> <p>- تم إنجاز ٨ أقسام طوارئ وتم إستلامها - قسم للطوارئ في محافظة معان / تم طرح العطاء وإحالته - هناك قسم طوارئ في محافظة جرش تم تأجيله لعام ٢٠٠٩ - ١٠٠% (٨ أقسام طوارئ) يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات</p>	<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع</p> <p>الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع</p>
<p>يهدف المشروع إلى توسعة أقسام الإسعاف والطوارئ للمستشفيات القائمة</p>	<p>ملاحظات</p>

بالآلف دينار

٦- مشروع مستشفى السكري والغدد الصماء	
<p>٢٠٠٠ ١٢ شهراً / مستمر ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠% ١٠٠%</p> <p>المخصص الموجود في موازنة ٢٠٠٨ هو دعم للمركز الوطني للسكري والغدد الصماء - ١٠٠% تم تحويل (٢٠٠٠) ألف دينار لغاية ٢٠٠٨/١٢/٣١ للمركز الوطني للسكري والغدد الصماء</p>	<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع</p> <p>الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع</p>
<p>يهدف المشروع إلى دعم المركز الوطني للسكري والغدد الصماء لإنشاء مستشفى متخصص لأمراض السكري والغدد الصماء (موقع المشروع محافظة العاصمة)</p>	<p>ملاحظات</p>

بالألف دينار

٧- مشروع إنشاء (٣) مديريات تنمية إجتماعية	
٢٠٠٠ ٢٤ شهراً ٢٥٠ -	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع
- إنشاء مديرية تنمية (المفرق ، السلط) قيد الدراسة وإعداد التصاميم . - إنشاء مديرية تنمية العقبة – تم الإنتهاء من إعداد التصاميم والدراسات وتم طرح عطاء التنفيذ وإحالته -	الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع
١٠% المشروع يسير دون المستوى المخطط له	ملاحظات
يهدف المشروع إلى تملك الوزارة للأبنية الحكومية المشغولة من قبلها لخدمة الفئات المستفيدة ومتابعة تنفيذ اعمال الوزارة	

بالألف دينار

٨- مشروع إنشاء مبنى جديد لوزارة النقل	
٤٠٠٠ ٣٦ شهراً ٤٦٥ ٤٩١ ١٠٦% ١٠% -	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع
تم الإنتهاء من إعداد الدراسات والتصاميم وتم طرح العطاء وإحالته في شهر كانون أول ٢٠٠٨ -	الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع
١٠% المشروع يسير حسب المخطط المعدل له بسبب التأخر في طرح وإحالة العطاء	ملاحظات
يهدف المشروع إلى إنشاء مبنى إضافي جديد مناسب لوزارة النقل بمساحة إجمالية تبلغ (٥٠٠٠) متر (٨) طوابق وينفذ على (٣) سنوات بالإضافة إلى إعادة تأهيل البناء القديم بحدود (٢٠٠٠) م .	

بالآلف دينار

٩ - مشروع إنشاء مبنى مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني	
٦٠٠٠	الكلفة الكلية
٢٤ شهراً / جديد	مدة التنفيذ
٢٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٨
١٠	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
%٥	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨
%٥	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
في طور الإنتهاء من الدراسات وإعداد التصاميم	سير العمل في المشروع
-	الأوامر التغييرية
-	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:
المشروع يسير دون المستوى المخطط له	تقييم المشروع
يهدف المشروع إلى إنشاء مبنى يخدم مهام المركز	ملاحظات

بالآلف دينار

١٠ - مشروع إنشاء مبنى ديوان الخدمة المدنية	
٤٠٠٠	الكلفة الكلية
٣٦ شهراً	مدة التنفيذ
١٤٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٨
١٣٢٩	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
%٩٥	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨
%٣٠	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
تم إحالة العطاء على المقاول شركة يوسف سمارة والعمل جارٍ في موقع المشروع	سير العمل في المشروع
-	الأوامر التغييرية
%١٥	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:
تم إحالة العطاء وإحالاته للمرة الثانية نظراً لإنسحاب المقاول المحال عليه سابقاً حيث تم الإنتهاء من القواعد الأساسية للمبنى.	تقييم المشروع
	ملاحظات

بالآلف دينار

١١ - مشروع إكمال إنشاء مبنى مديرية الجنسية وشؤون الأجانب	
٤٥٠	الكلفة الكلية
٢٠٠٨-٢٠٠٧	مدة التنفيذ
١٥٠	مخصصات عام ٢٠٠٨
١٥٠	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
%١٠٠	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨
%١٠٠	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
تم الإنتهاء من المشروع وتم تسليمه أولاً	سير العمل في المشروع

- %١٠٠ يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات	الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع
توسعة مبنى وزارة الداخلية / تساهم أمانة عمان بجزء من تكلفة المشروع	ملاحظات

بالألف دينار

١٢ - مشروع تطوير وتحديث الأبنية / الأمن العام	
 <p>١٠٤٥٠ سنوي مستمر ١٠٤٥٠ ١٠٤٥٠ %١٠٠ %١٠٠</p> <p>العمل مستمر في المشروع - %١٠٠ لمبنى القيادة والسيطرة %٢٥ لمبنى مديرية الأمن العام يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات</p>	<p>الكلفة الكلية</p> <p>مدة التنفيذ</p> <p>مخصصات عام ٢٠٠٨</p> <p>الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١</p> <p>نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨</p> <p>نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:</p> <p>تقييم المشروع</p>
يهدف المشروع إلى إنشاء مراكز ومديريات الشرطة وتوسعة القائم منها	ملاحظات

بالألف دينار

١٣ - مشروع تحديث الأبنية / وزارة الداخلية / الأمن العام	
<p>١١٠٠ سنوي مستمر ١١٠٠ ١١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ تم الإنتهاء من تحديث الأبنية لعام ٢٠٠٨ - %١٠٠ يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات</p>	<p>الكلفة الكلية</p> <p>مدة التنفيذ</p> <p>مخصصات عام ٢٠٠٨</p> <p>الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١</p> <p>نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨</p> <p>نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:</p> <p>تقييم المشروع</p>
يهدف المشروع إلى إنشاء وتوسعة مديريات ومراكز الترخيص	ملاحظات

بالألف دينار

١٤ - مشروع إنشاء مبنى دار القضاء العالي	
<p>٧٢٠٠ ٣٦ شهراً ١٥٠٠ تم إجراء مناقلات بكامل المخصص</p> <p>- - المشروع في مرحلة الدراسات وإعداد التصاميم. تم تحديد قطعة الأرض في منطقة الرونق وبعدها تم تغيير قطعة الأرض إلى منطقة أخرى / شارع الإستقلال</p> <p>- - المشروع يسير دون المستوى المخطط له بسبب تغيير الموقع وأصبح بحاجة لدراسات وتصاميم جديدة حيث طرح عطاء الدراسات من جديد (مسابقة معمارية)</p>	<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع</p> <p>الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع</p>
<p>يهدف المشروع إلى إنشاء مبنى جديد لدار القضاء العالي ضمن خطة وزارة العدل لان تكون مباني المحاكم حديثة ومستقلة لتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة والإستقلال القضائي</p>	<p>ملاحظات</p>

بالآلف دينار

١٥ - مشروع إنشاء مبنى محكمة الجنايات الكبرى	
<p>٢٠٠٨ تشرين أول</p>  <p>٢٠٠٨ كانون أول</p> 	<p>٤٣٥٠</p> <p>٣٦ شهراً</p> <p>٢٨٠٠</p> <p>١٦١٦</p> <p>%٥٨</p> <p>%٨٥</p>
<p>تم طرح العطاء وإحالته على شركة اللفداوي للمقاولات وتمت المباشرة بأعمال التنفيذ بتاريخ ٢٠٠٨/٧/٢٣ والاشراف على مكتب هندسي مهيب مدانات، والعمل مستمر على أرض الواقع حيث تم الانتهاء من التسوية وتجهيز عقدة الطابق الأرضي.</p> <p>-</p> <p>%٢٠</p> <p>يسير بنسب أعلى من المخطط له</p>	<p>الكلفة الكلية</p> <p>مدة التنفيذ</p> <p>مخصصات عام ٢٠٠٨</p> <p>الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١</p> <p>نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨</p> <p>نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨ : ٢٠٠٨</p> <p>سير العمل في المشروع</p> <p>الأوامر التغييرية</p> <p>نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:</p> <p>تقييم المشروع</p> <p>ملاحظات</p>
-	-

بالآلف دينار

١٦ - مشروع إنشاء مبنى المعهد القضائي	
<p>٣٦٥٠</p> <p>٢٠١٠-٢٠٠٨</p> <p>١٥٠٠ تم إجراء مناقلات بكامل المخصص</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>يتم السير في إجراءات المشروع عند تحديد موقع المدينة القضائية وتنفيذها/حسب ملاحظة وزارة العدل</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>المشروع متوقف لا يسير ضمن المخطط</p>	<p>الكلفة الكلية</p> <p>مدة التنفيذ</p> <p>مخصصات عام ٢٠٠٨</p> <p>الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١</p> <p>نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨</p> <p>نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨ : ٢٠٠٨</p> <p>سير العمل في المشروع</p> <p>الأوامر التغييرية</p> <p>نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:</p> <p>تقييم المشروع</p> <p>ملاحظات</p>
-	-

بالآلف دينار

١٧ - مشروع مبنى دائرة قاضي القضاة		
<p>٢٠٠٨ أول كانون</p> 	<p>١٢٠٠٠ ٣٦ شهراً / جديد ٩٠٠ ٢٩٦ ٣٣% ١٠%</p>	<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:</p>
<p>العمل جارٍ في موقع المشروع حيث تم تجريف التربة وفحصها</p>	<p>سير العمل في المشروع</p>	<p>الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع</p>
<p>- ١٠% المشروع يسير دون المستوى المخطط له بسبب التأخر في طرح وإحالة العطاء</p>	<p>-</p>	<p>ملاحظات</p>
<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

بالف دينار

١٨ - مشروع إستملاك أراضي لمخيم الحسين و مخيم مادبا		
<p>٣٠٣٠ ٢٠١٠-٢٠٠٧ ١٤١٥</p>	<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع</p>	<p>الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع</p>
<p>تم إصدار قرارات من المحكمة المختصة بالإستملاك الفوري لصالح دائرة الشؤون الفلسطينية</p>	<p>هناك اعتراضات من أصحاب قطعة الأرض (في مخيم الحسين ومخيم مادبا) على القيمة المقدرة للأرض من قبل اللجان المختصة</p>	<p>ملاحظات</p>
<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

بالآلف دينار

١٩ - مشروع البرنامج الوطني لإنشاء المباني الحكومية	
١٥٠٠٠ سنوي	الكلفة الكلية
مستمر	مدة التنفيذ
١٥٠٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٨
١٣٠٦٥	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
٨٧%	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨
٨٥%	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
المشروع هو لتسديد أقساط وفوائد البرنامج الوطني لإنشاء المباني الحكومية	سير العمل في المشروع
-	الأوامر التغييرية
-	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:
يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات	تقييم المشروع
مشروع سنوي يهدف إلى تنفيذ مجموعة من مشاريع الأبنية لعدد من الوزارات والدوائر الحكومية	ملاحظات

بالآلف دينار

٢٠ - مشروع المجلس الأعلى لرعاية المعوقين	
١٣٥٠٠	الكلفة الكلية
٢٠١٠-٢٠٠٨	مدة التنفيذ
٤٥٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٨
٢٢٥٠	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
٥٠%	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨
٥٠%	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
المشروع هو دعم من الخزينة للنفقات الرأسمالية للمجلس	سير العمل في المشروع
-	الأوامر التغييرية
-	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:
يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات	تقييم المشروع
يهدف المشروع إلى مساهمة من الحكومة لإنشاء المجلس الأعلى لرعاية المعوقين لكافة مناطق ومحافظات المملكة	ملاحظات

بالألف دينار

٢١ - مشروع تأهيل مكاتب النفايات	
١٤٠٠٠ ٦٠ شهراً ١٦٢٥ ١٨٣١ %١١٣ %١٠٠ - تم شراء الآليات وتم تسليمها . - تم طرح وإحالة عطاءات تنفيذ البنية التحتية لمجالس الخدمات المشتركة (تأهيل طرق ، بناء مكاتب للحراس ، إنارة) مكاتب النفايات . - %١٠٠ يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨ : سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع
يهدف المشروع إلى تأهيل وشراء آليات لمكاتب النفايات البالغ عددها (١٦) مكب .	ملاحظات

بالألف دينار

٢٢ - مشروع مكافحة الفقر من خلال التنمية المحلية	
٥٠٠٠ سنوي مستمر ٥٠٠٠ ٥٥٠٠ %١١٠ %١٠٠ تم فتح حساب وتمويل في بنك التنمية لصالح (١٨) بلدية في المملكة كل بلدية (٢٧٧) ألف دينار . يتم التمويل من الدولة المانحة حسب التنفيذ والإنجاز . - %١٠٠ يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨ : سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع
يهدف المشروع إلى تفعيل الدور التنموي للبلديات وإشراكها في التنمية المستدامة من خلال إقامة مشاريع إنتاجية تساهم في الحد من البطالة والفقر في المجتمعات المحلية وتوفير لها دخلاً مستداماً طويل المدى.	ملاحظات

بالألف دينار

٢٣- مشروع محطة توليد الكهرباء الثاني / المناخر		
<p>تشرين أول ٢٠٠٨</p> 	<p>٢٧٠٠ ٢٤ شهرا ٨٥٠ ٣١٩</p>	<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١</p>
<p>تم الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع وتم تسليمه والمخصص الموجود ضمن موازنة ٢٠٠٨ مطالبات للإستملكات .</p>	<p>٣٧.٥ % ١٠٠ %</p>	<p>نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨ : سير العمل في المشروع</p>
<p>يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات</p>	<p>١٠٠ %</p>	<p>الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع</p>
<p>يهدف المشروع إلى القيام باعمال المتابعة وتسهيل مهام مطور المشروع في تنفيذه (إنشاء محطة توليد كهرباء)</p>		<p>ملاحظات</p>

بالألف دينار

٢٤- مشروع استغلال طاقة الرياح لتوليد الكهرباء (الحرير ، الطفيلة)		
<p>١١٥٢٢ ٢٠١١-٢٠٠٨ ١٠٠٠ ٤٢٥ (تم تدوير المبلغ في حساب الأمانات/وزارة المالية) ٤٢.٥ %</p>	<p>١١٥٢٢ ٢٠١١-٢٠٠٨ ١٠٠٠ ٤٢٥ (تم تدوير المبلغ في حساب الأمانات/وزارة المالية) ٤٢.٥ %</p>	<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨ : سير العمل في المشروع</p>
<p>تم تأجيل المشروع لعام ٢٠٠٩</p>	<p>٢٠٠٩</p>	<p>الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع</p>
<p>المشروع متوقف بسبب تعرض البرج القياسي للسرقة مما أدى إلى توقف القياسات في البرج من بداية عام ٢٠٠٨</p>		<p>ملاحظات</p>
<p>يهدف المشروع إلى توليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح للمساهمة في توفير الوقود وتقليل حجم الفاتورة النفطية وتشجيع إستثمارات القطاع الخاص في هذا المجال وخفض الانبعاثات البيئية .</p>		

بالآلف دينار

٢٥ - مشروع تأسيس صندوق كفاءة الطاقة	
٥٠٠٠ سنوي مستمر ٧٥٠ ٧٥٠ (تم تدوير المبلغ في حساب الأمانات / وزارة المالية) -	<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع</p> <p>الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع</p>
<p>يتم تأسيس صندوق كفاءة الطاقة بعد إقرار قانون الطاقة المتجددة والآن القانون في مراحل الدستورية - يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات</p>	<p>ملاحظات</p>
<p>مشروع سنوي لتنفيذ عدد من الإجراءات الضرورية الواردة في الإستراتيجية الوطنية لتحسين كفاءة إستهلاك الطاقة وتحفيز الجهات المانحة الدولية لدعم صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة</p>	

بالآلف دينار

٢٦ - مشروع اليوار نيوم	
٦٠٠ مستمر ٤٧ -	<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع</p> <p>الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع</p>
<p>لم يتم الإنفاق على المشروع بسبب تحويله إلى هيئة الطاقة الذرية حيث تم عمل مناقلات منه لمشاريع أخرى -</p>	<p>ملاحظات</p>
<p>يهدف المشروع إلى دراسة المناطق الإستكشافية وتقييم المعلومات الفنية المتوفرة</p>	

بالآلف دينار

٢٧- مشروع تحديث مرصد الزلازل	
٤٥٠ سنوي مستمر ٥٩٠ ٥٩٠ ١٠٠% ١٠٠% تم طرح العطاء وإحالته في شهر كانون الأول ٢٠٠٨ - ١٠% يسير دون المستوى المخطط له	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع
العمل على تحديث وتجهيز مرصد الزلازل الأردني وتزويده بأحدث الأجهزة والمعدات حسب التطورات العالمية الحالية .	ملاحظات

بالآلف دينار

٢٨- مشروع التنقيب عن البترول من خلال تسويق المناطق الإستكشافية	
١٠٠٠ سنوي مستمر ٨٣٥ ٤٧٢.٥ ٥٦.٦% ٥٠% العمل جارٍ حالياً في موقع سلطة المصادر الطبيعية لتسويق المناطق الإستكشاف البترولي - ١٠٠% يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع
مشروع سنوي لدراسة المناطق الإستكشافية الحالية وتقييم المعلومات الفنية المتوفرة لغايات إعادة تقييمها مجدداً وحسب مساحات التراكيب الجيولوجية إلى مساحات أقل من المعتمدة حالياً .	ملاحظات

بالآلف دينار

٢٩ - مشروع صيانة وتأهيل المبنى الجديد / دائرة مراقبة الشركات	
٥٠٠ ٤ أشهر / جديد ٢٥٠ - - - تم طرح العطاء وإحالته ومن المتوقع المباشرة بالتنفيذ خلال شهر كانون الثاني ٢٠٠٩ - ١٠% المشروع يسير دون المستوى المخطط له بسبب التأخير في طرح وإحالة العطاء	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع
يهدف المشروع إلى تأهيل مبنى مؤسسة المواصفات والمقاييس ليتناسب مع حجم وطبيعة عمل دائرة مراقبة الشركات	ملاحظات

بالآلف دينار

٣٠ - مشروع حزمة الأمان الإجتماعي	
٥٠٠٠ سنوي مستمر ٣٧٩٠ (خزينة وقروض) ٣٥٨٢ ٩٤.٥% ٩٠% - المشروع قيد التنفيذ - يتكون المشروع لعام ٢٠٠٨ من : ١- تأهيل مساكن الأسر الفقيرة في المخيمات ٢- تطوير البنية التحتية في حي الزطايمة / جرش (استبدال شبكات المياه ، عمل أرصفة) ٣- مشروع توسعة الطرق الرئيسية في مخيم البقعة - ٧٥% يسير حسب المخطط ولكن يوجد تأخير في تنفيذ بعض مشاريع البرنامج بسبب تأخير المقاولين	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع
يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الفقيرة	ملاحظات

بالألف دينار

٣١ - مشروع تطوير السياحة الثالث	
٥٠٠٠٠	الكلفة الكلية
٢٠١٢-٢٠٠٧	مدة التنفيذ
٢٤٩٥ (خزينة وقروض)	مخصصات عام ٢٠٠٨
٢٤٩٥	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
%١٠٠	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨
%٩٥	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
- يجري حالياً العمل على تقييم العروض الخاصة بعطاء إعداد التصاميم والإشراف على مشروع تطوير وإعادة تأهيل الطرق والبنية التحتية في عجلون وتأهيل مجمع الباصات في جرش	سير العمل في المشروع
- يتم حالياً تنفيذ تأهيل مسجد السلط وتأهيل شبكة الطرق والبنية التحتية وصيانة مبنى السرايا في وسط مدينة مادبا	الأوامر التغييرية
- تم إحالة عطاء تنفيذ تأهيل شبكة الطرق والبنية التحتية في وسط مدينة جرش ، تمت المباشرة في التنفيذ بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/١٥	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:
- %٢٠ لمواقع السلط	تقييم المشروع
- %١٥ لمواقع مادبا	ملاحظات
- يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات	
يهدف المشروع إلى تطوير وسط كل من مدن جرش ، مادبا ، الكرك ، السلط وعجلون وذلك بالتعاون مع البلديات المعنية .	

بالألف دينار

٣٢ - مشروع تطوير القطاع السياحي	
٤٠٠٠٠	الكلفة الكلية
٢٠٠٩-٢٠٠١	مدة التنفيذ
٢٦١١	مخصصات عام ٢٠٠٨
٢٦٠٢	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
%٩٩.٧	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨
%٩٥	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
يتضمن المشروع (٧) مكونات رئيسية :	سير العمل في المشروع
- تم الإنتهاء من تنفيذ (٥) مشاريع وتسليمها وهي (تطوير وسط عمان ، تطوير الكرك ، مجمع باصات رعدان ، طريق البحر الميت/ماعين ، بنوراما/البحر الميت)	الأوامر التغييرية
- مشروع متحف السلط - تم الإنتهاء من المشروع	
- المتحف الوطني (عمان) العمل جارٍ في موقع المشروع	
-	

نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:	مشروع متحف السلط ١٠٠% المتحف الوطني ٦٨% يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات
تقييم المشروع	
ملاحظات	

بالألف دينار

٣٣- مشروع بناء (٢٥) مدرسة أساسية	
الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع	٣٣٠٠٠ المستوى الوطني ٢٠٠٣-٢٠٠٩ ١٤٣٦ (خزينة وقروض) ١٤١٨ ٩٨.٧% ٩٥% يمر المشروع على مرحلتين: - المرحلة الأولى تم إستلام ١٠ مدارس في عام ٢٠٠٨ في المناطق الأشد فقراً حسب شروط بنك الإعمار الألماني - تم طرح وإحالة عطاءات لـ (٦) مدارس في مختلف محافظات المملكة - ٧٠% يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات
الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع	
ملاحظات	يهدف المشروع إلى توفير مباني المدارس الأساسية بهدف إستبدال المباني المستأجرة وتخفيف نظام الفترتين

بالألف دينار

٣٤- مشروع إنشاء صندوق التراث	
الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع	٣٠٠ سنوي مستمر ٣٠٠ ٣٠٠ ١٠٠% ١٠٠% تم فتح حساب للإنفاق على ترميم المباني التراثية في المملكة وتم وضع دراسات ومعايير لترميم هذه المباني من قبل الوزارة - ١٠٠% يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات
الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع	
ملاحظات	يهدف إلى تأمين نفقات التأسيس لإنشاء صندوق التراث للمحافظة على التراث العمراني والحضري للمساهمة في تقدير وتنويع المنتج السياحي

بالألف دينار

٣٥- مشروع إنشاء شركة إدارة وتطوير المواقع السياحية	
١٥٠٠ ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ٥٠٠ - - يوجد قرار مبدئي من دولة رئيس الوزراء لتأسيس الشركة: - تم استكمال الدراسات والتصاميم وتم عرضها على دولة الرئيس - بانتظار الموافقة النهائية من دولة الرئيس لتأسيس الشركة - - يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع
يهدف المشروع إلى إنشاء شركة لإدارة وتطوير المواقع السياحية لتوفير أفضل الخدمات في المواقع السياحية وإدارة وتشغيل المواقع بكفاءة عالية	ملاحظات

بالألف دينار

٣٦- مشروع المتحف الوطني	
١٦٠٠٠ مستمر ٦٥٠ ٥٨٠ %٨٩ %٩٠ هذا المشروع ممول من القرض الياباني والعمل جار في موقع المشروع للأعمال الهيكلية (قاعات العرض الأربعة والمستودعات والخدمات الكهروميكانيكية والحدائق والساحات الخارجية) - %٦٨ يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات ومتوقع الإنتهاء من المشروع بتاريخ ٢٠٠٩/١٠/٣١	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع
يهدف إلى تأمين المتطلبات الإدارية والمالية لإدارة المتحف الوطني	ملاحظات

بالألف دينار

٣٧- مشروع التنمية الإقليمية والمحلية	
٣٦٠٠	الكلفة الكلية
٢٤	مدة التنفيذ
١٨٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٨
٣٢٦	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
%١٨	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨
%١٥	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
تم طرح العطاء وإحالته في شهر آب ٢٠٠٨	سير العمل في المشروع
-	الأوامر التغييرية
%٣٥	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:
يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات	تقييم المشروع
يهدف المشروع إلى بناء القدرات المؤسسية لوزارة الشؤون البلدية وبنك تنمية المدن والقرى والبلديات	ملاحظات

تم بحمد
