

محافظة الطفيلة

محافظة الطفيلة

لمحة عامة:



تعتبر محافظة الطفيلة من المحافظات المتميزة بتتنوعها الجغرافي والمناخي، وتميزت بوجود العديد من الموارد الطبيعية مثل الأراضي الصالحة للزراعة، وكذلك الموارد المعدنية كالفوسفات والاسمنت والنحاس، ويعتبر قطاع التعدين من الأنشطة الرئيسية في المحافظة حيث توجد مناجم الفوسفات في لواء الحسا، ومصنع الاسمنت في لواء بصيرا ، ولهذه الأنشطة أهمية كبرى على المستوى الوطني حيث تساهم بجزء كبير من الصادرات الوطنية.

التضاريس والمناخ:

ت تكون تضاريس المحافظة من سلاسل جبلية يتراوح ارتفاعها عن سطح البحر ما بين (١٢٠٠م) في الجبال الواقعة إلى الشرق من مدينة الطفيلة و(١٦٠٠م) في منطقة القادسية وغرنل، ويخلل هذه السلاسل العديد من الأودية العميقة، وهذا الجزء من المحافظة يعتبر من المناطق شبه الجافة التي لا يزيد معدل هطول الأمطار السنوي فيها عن (٢٨٨) ملم. أما الجزء الشرقي من المحافظة مناخه صحراوي، ولا يزيد معدل هطول الأمطار السنوي فيه عن (٥٠) ملم.

الموقع والمساحة:

تقع محافظة الطفيلة في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة، وتبعد عن العاصمة عمان حوالي ١٨٣ كم، وتبلغ مساحة المحافظة ٢١٣٢ كم^٢ ، أي ما يعادل ٤٪ من المساحة الإجمالية للمملكة.

الواقع السكاني والكثافة السكانية:

بلغ معدل النمو السكاني بين عامي ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧ حوالي (٢.١٥٪) ، وقدر عدد سكان محافظة الطفيلة حسب دائرة الإحصاءات العامة لعام ٢٠٠٧ بحوالي (٨٠١٠٠) نسمة أي ما نسبته (١.٥٧٪) من سكان المملكة، ويتوزع هؤلاء السكان على (٤١) تجمعاً سكانياً، أهمها مدينة الطفيلة، وعين البيضا، والعيسى، وبصيرا، والحسا، أما باقي السكان فيتوزعون على باقي التجمعات السكانية، وتشكل نسبة السكان الذين يقطنون الريف حوالي (٢٥.١٪) في حين يشكل نسبة الحضر (٧٤.٩٪) من إجمالي عدد سكان المحافظة، وتبلغ الكثافة السكانية (٣٧.٦) شخص/كم^٢ ، وبلغ عدد الأسر (١٤٠٥٣) أسرة حيث بلغ متوسط حجم الأسرة (٥.٧)، فرد، وفيما يتعلق بتوزيع السكان حسب الجنس فتشير الإحصاءات إلى أن نسبة الذكور تصل إلى (٥٠.٩٪)، ونسبة الإناث (٤٩.١٪) من إجمالي عدد سكان المحافظة. والجدول التالي يبيّن توزيع السكان حسب الجنس وللواء والكثافة السكانية في محافظة الطفيلة.

الجدول رقم (١)

التوزيع السكاني حسب الجنس وللواء والكثافة السكانية في محافظة الطفيلة

معدل الكثافة السكانية فرد/كم ^٢	النسبة %	المساحة كم ^٢	النسبة من المحافظة %	عدد السكان (نسمة)	اللواء	
					إناث	ذكور
٤٥.٣	٥١.٧	١١٠٢	٦٢.٣	٢٤٤٠٠	٢٥٥٠٠	قصبة الطفيلة
٤٢.٩	٢٢.٦	٤٨٠	٢٥.٧	١٠١٢٠	١٠٤٧٠	بصيرا
١٧.٥	٢٥.٨	٥٥٠	١٢.٠	٤٧٨٠	٤٨٣٠	الحسا
٣٧.٦	١٠٠	٢١٣٢	١٠٠	٨٠١٠٠		المجموع

المصدر :- دائرة الإحصاءات العامة، ٢٠٠٦.

التقسيمات الإدارية:


كانت الطفيلة ومنذ عهد الإمارة وحدة إدارية تتبع إلى محافظة الكرك وبتاريخ ١٩٨٥/١٢/١٦ صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيعها من لواء إلى محافظة، وبموجب نظام التقسيمات الإدارية لعام ١٩٩٥ ، أصبحت الطفيلة تتألف من الوحدات الإدارية التالية:

أولا : لواء قصبة الطفيلة ومركزه مدينة الطفيلة.

ثانيا : لواء بصيرا.

ثالثا : لواء الحسا.

الخارطة رقم (١) خارطة محافظة الطفيلة حسب الألوية والقرى

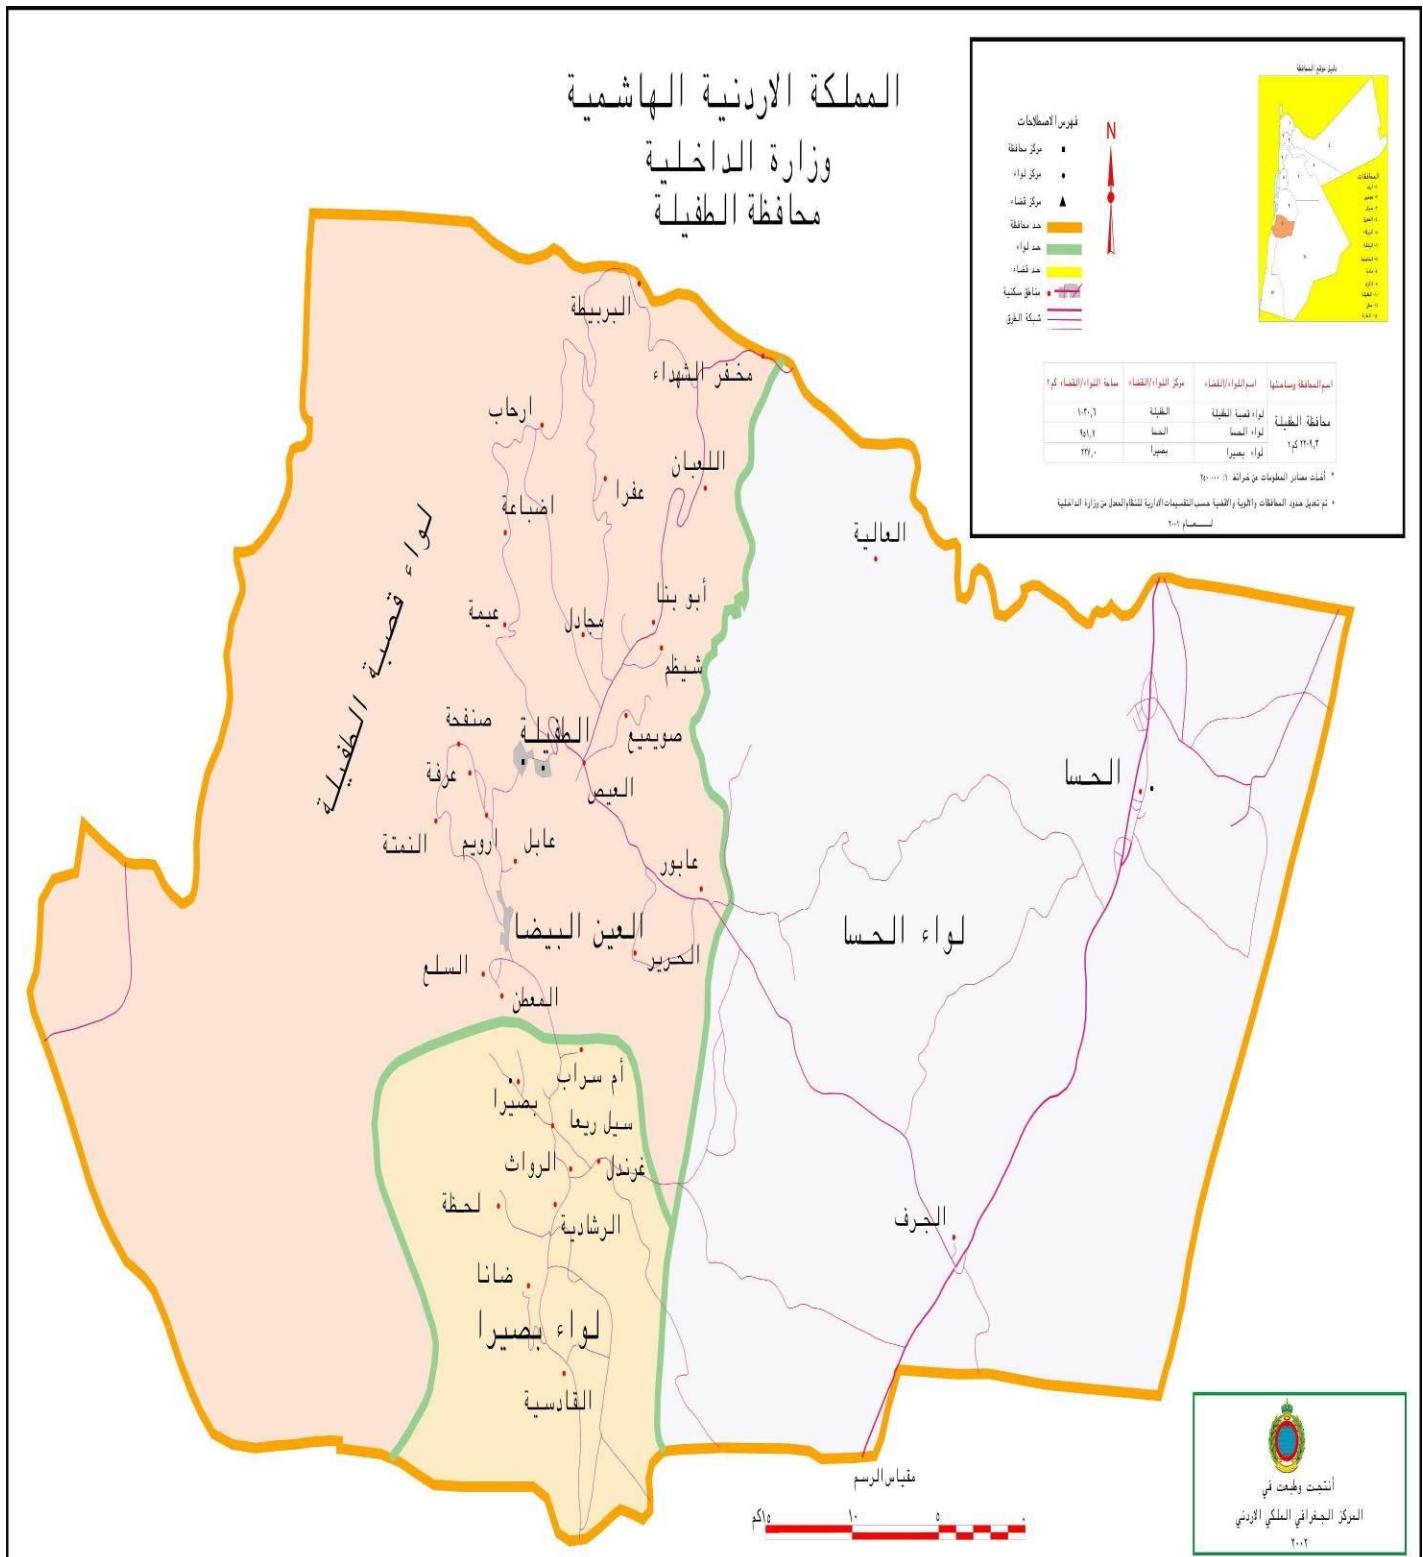

أبرز المشاريع الرأسمالية لمحافظة الطفيلة

(بالملايين)

الرقم	اسم المشروع	الجهة المنفذة	مخصصات ٢٠٠٨	نسبة الإنفاق %	نسبة الإنجاز %	الملاحظات
١.	إنشاءات مختلفة وإضافات غرف صفية .	وزارة التربية	٧٥	١٠٠	١٠٠	-
٢.	تحريج الأراضي المحيطة بالسدود.	وزارة الزراعة	٢٠	٩١.١	٧٠	-
٣.	الحزام الأخضر.	وزارة الزراعة	١٣٠.٣	٩٨.٨	١٠٠	-
٤.	إدارة الموارد الطبيعية لمحافظتي الكرك والطفيلية.	وزارة الزراعة	٣٧٢.٧	٤١.٩	٧٥	-
٥.	طريق العيص/العين البيضاء.	وزارة الأشغال	٣٠٠	١٠٠	١٠٠	-
٦.	صيانة الطرق الزراعية.	وزارة الأشغال	١٧٤.٣	١٠٠	١٠٠	-
٧.	إكمال طريق الطفيلة - الحسا.	وزارة الأشغال	٢٥٠٠	١٠٠	٤٠	المشروع متاخر بسبب طبيعة التضاريس.
٨.	إسكان الأسر الفقيرة.	وزارة الأشغال	٢٠٣.٩	١٠٠	٩٩	-
٩.	إنشاء وتحسين الطرق الفروية والثانوية.	وزارة الأشغال	٣١٩.٧	١٠٠	٩٠	-
١٠.	إنشاء مركز الطفيلة لذوي الاحتياجات الخاصة.	وزارة التنمية الاجتماعية	٧١٨	٢٥.٩	١٥	المشروع يسير بشكل جيد ونسب إنجاز أعلى من المتوقع.
١١.	إنشاء المدينة الصناعية في الطفيلة.	وزارة المالية	٤٠٠٠	٢٥	٣٥	نسبة الإنجاز تشمل في أعمال الصور فقط.
١٢.	إضافات غرف صفية لرياض الأطفال.	وزارة التربية	٥٠	٩٠	٩٨	-
١٣.	طريق الطفيلة الدائري.	وزارة الأشغال	٤٥٠	٩٨.٩	-	تم إحالة العطاء على شركة الحنقطة ومن المتوقع أن يتم المباشرة في المشروع في بداية شهر شباط ٢٠٠٩.

خلاصة التقييم لأهم المشاريع التنموية والرأسمالية لمحافظة الطفيلة

مخصصات النفقات الرأسمالية للمشاريع التنموية في قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٠٨

بلغت مخصصات المشاريع الرأسمالية لمحافظة الطفيلة (١٤٥٧٧.٤) ألف دينار لعام ٢٠٠٨ في حين بلغ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ (١٠٤٢٥.٥) ألف دينار أي ما نسبته (٧١.٥%) وهي نسبة أقل من المستوى المستهدف. كما في الشكل رقم (١).


(بألف دينار)

البيان	المقدار ٢٠٠٨	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١	نسبة الإنفاق الفعلي %
المشاريع الرأسمالية	١٤٥٧٧.٤	١٠٤٢٥.٥	٧١.٥

المصدر: دائرة الموازنة العامة، ٢٠٠٨.

الشكل رقم (١)


مقارنة الإنفاق الفعلي للمشاريع الرأسمالية حسب القطاعات
لمحافظة الطفيلة

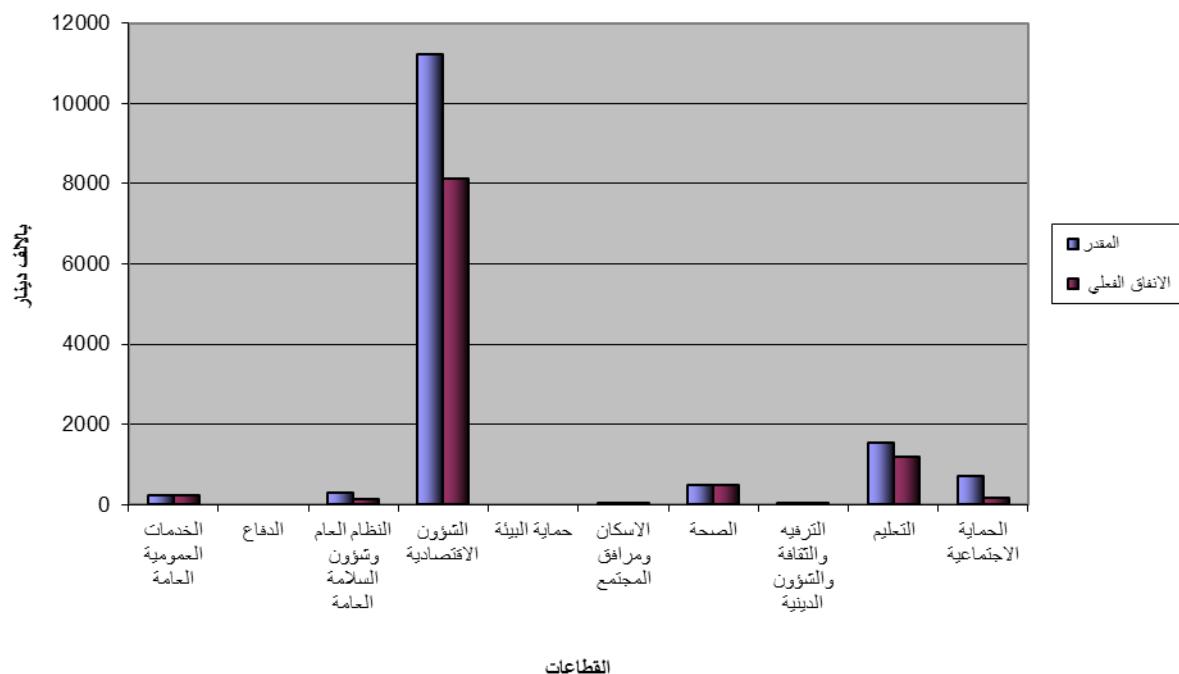

ويشير توزيع مخصصات المحافظة حسب القطاعات الوظيفية إلى إستثمار قطاع الشؤون الإقتصادية على ما نسبته (٧٧٪) من إجمالي مخصصات محافظة الطفيلة لعام ٢٠٠٨ وذلك من أجل تنمية المحافظة اقتصادياً والمساهمة في تخفيض معدلات البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة في مشاريع البنية التحتية ومشاريع تعزيز الإنتاجية وتحفيز الإستثمارات المحلية ، وجاء في المرتبة الثانية قطاع التعليم والذي حاز على ما نسبته (٥٠٪) من إجمالي مخصصات المحافظة وتلاه قطاع الحماية الإجتماعية كما هو واضح في الشكل رقم (٢) .

الشكل رقم(٢)

التوزيع القطاعي للمشاريع الرأسمالية لمحافظة الطفيلة

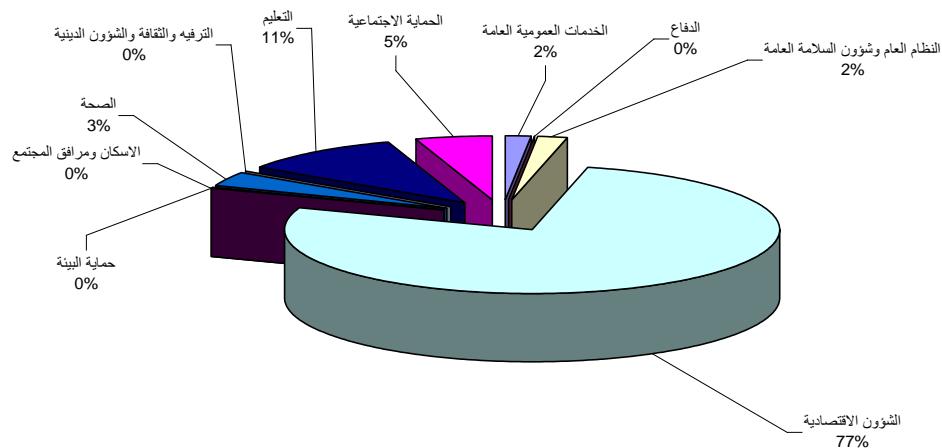

الحماية الاجتماعية ■ التعليم ■ الترفيه والتقاليد والشئون الدينية ■ الصحة ■ الإسكان ومرافق المجتمع ■ حماية البيئة ■ الشئون الاقتصادية ■ إنفاق المخالص ■ الدفع ■ الخدمات العامة

وفي ما يلي تحليلاً موجزاً لأهم مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب الفصول:-

الأشغال العامة والإسكان :-

حظيت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالمرتبة الأولى من حيث حجم المخصصات المرصودة لمحافظة، حيث تم رصد مبلغ (٦٣١٠.١) ألف دينار مشكلة ما نسبته (٤٣.٣٪) من إجمالي المخصصات المرصودة لمحافظة، وتم إنفاق (٦٣٠٢.٣) ألف دينار أي ما نسبته (٩٩.٩٪) من المخصصات المرصودة لوزارة الأشغال العامة والإسكان في المحافظة حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١.

ال التربية والتعليم :-

تم رصد مبلغ (١٢٢٥.١) ألف دينار أي ما نسبته (٤%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة، وبلغ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ (٩٨٨.٧) ألف دينار أي ما نسبته (٧%) من المخصصات المرصودة لوزارة التربية والتعليم في المحافظة.

الصحة :-

بلغت المخصصات المرصودة لوزارة الصحة في المحافظة (١٤٧.٢) ألف دينار مشكلة ما نسبته (٥١%) من إجمالي المخصصات للمشاريع الرأسمالية في المحافظة، كما بلغ الإنفاق الفعلي حتى تاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١ (١٤٠.٦) ألف دينار أي ما نسبته (٩٥.٥%) من مخصصات وزارة الصحة في محافظة الطفيلة.

الزراعة :-

بلغت المخصصات المرصودة لوزارة الزراعة في المحافظة (١٧٧٤.١) ألف دينار مشكلة ما نسبته (٥٠.٣٪) من إجمالي المخصصات المرصودة للمشاريع الرأسمالية في المحافظة، وقد تم إنفاق (٦٧٦.٣) ألف دينار أي ما نسبته (٨٧.٤٪) من المخصصات المرصودة لوزارة الزراعة في المحافظة حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١.

السياحة والآثار :-

بلغت المخصصات المرصودة لمشاريع السياحة والآثار (٣٤١.٣) ألف دينار مشكلة ما نسبته (٢٠.٣٪) من إجمالي المخصصات المرصودة للمشاريع الرأسمالية في المحافظة تم إنفاق (٣٣٤) ألف دينار أي ما نسبته (٩٧.٩٪) من المخصصات المرصودة لوزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة في المحافظة حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١

وفيما يلي بطاقة وصف لأهم المشاريع التي تم تقييمها:-

(بالألف دينار)

١- مشروع إنشاءات مختلفة وأضافات غرف صفية

يتضمن المشروع تنفيذ عطائين لبناء غرف حاسوب حيث تم طرح العطائين في عام ٢٠٠٧ وقد نفذ العطاء الاول في المدارس التالية وبتكلفة -(٢٦١) ألف دينار :-	٢٢٤ شهرأ ٧٥ ٧٥ %١٠٠ %١٠٠	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الإنجاز لعام ٢٠٠٨ : سير العمل في المشروع.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>مدرسة فاطمة الزهراء .</p> <p>مدرسة عيمة الأساسية للبنين .</p> <p>مدرسة صنفحة الأساسية للبنين .</p> <p>مدرسة صنفحة الأساسية للبنات .</p> <p>مدرسة رحاب الثانوية للبنين .</p> <p>مدرسة رحاب الثانوية للبنين .</p> <p>مدرسة رحاب الثانوية للبنات .</p> <p>العطاء الثاني ويتضمن بناء (٥) قاعات في المدارس التالية :-</p> <p>مدرسة ميسلون الأساسية للبنات .</p> <p>مدرسة القادسية الأساسية للبنات .</p> <p>مدرسة الحسا الأساسية للبنات .</p> <p>مدرسة عايل الأساسية للبنين .</p> <p>مدرسة عين البيضاء الأساسية للبنين .</p>	<p>-</p>
<p>المشاريع تم تنفيذها حسب البرنامج المعد</p> <p>المبالغ المرصودة لعام ٢٠٠٨ هي فواتير متبقية للمقاول</p>	<p>لا توجد ١٠٠%</p>
	الأوامر التغیریة: نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع . ملاحظات

(بألف دينار)

٢ - مشروع تحريج الأراضي المحيطة بالسدود	
الكلفة الكلية	٥٠
مدة التنفيذ	سنوي / مستمر
مخصصات عام ٢٠٠٨	٢٠٠٨
الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١	٢٠٠٨
نسبة الإنفاق من المخصص	٩١.١%
نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨ :	٧٠%
سير العمل في المشروع:	يشتمل المشروع على تشجير الأراضي المحيطة بسد التنور
الأوامر التغیریة	بمساحة ١٠٠ دونم.
نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:	لا يوجد ٧٠%
تقييم المشروع	المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات .
ملاحظات:	

(بألف دينار)

٣ - مشروع الحزام الأخضر	
الكلفة الكلية	٦٠
مدة التنفيذ	٣ شهور
مخصصات عام ٢٠٠٨	١٣.٣

<p>%١٣.١</p> <p>%٩٨.٨</p> <p>%١٠٠</p> <p>يشتمل المشروع على تثجير الطريق الصحراوي بطول ٢ كم وبعرض ٢٥ م، تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى.</p> <p>لا يوجد %١٠٠</p> <p>المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات.</p>	<p>الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١</p> <p>نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨</p> <p>نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:</p> <p>سير العمل في المشروع</p> <p>الأوامر التغیرية</p> <p>نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:</p> <p>تقييم المشروع</p>
	ملاحظات

(بألف دينار)

٤- مشروع إدارة الموارد الطبيعية لمحافظتي الكرك والطفيلية-المرحلة الثانية

تشرين أول ٢٠٠٨



٢٩٩٠٠	الكلفة الكلية
٣٦ شهرًا	مدة التنفيذ
٣٧٢.٧	مخصصات عام ٢٠٠٨
١٥٦.٣	الإنفاق لغاية ٢٠٠٨/١٠/٣١

نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨
نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:

<p>العمل جارٍ في موقع المشروع وبنسب انجاز متفاوتة بين محافظتي الكرك والطفيلية.</p> <p>لا يوجد %٧٥</p>	<p>سير العمل في المشروع</p> <p>الأوامر التغیریة</p> <p>نسبة الانجاز مقارنة بالكافحة الاجمالية:</p> <p>تقييم المشروع</p>
<p>المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات.</p> <p>المشروع يقدم خدمات للمزارعين تتمثل في إقامة خزانات المياه وإقامة السلالس وعمل أسوار من الشيك</p>	<p>ملاحظات</p>

(بألف دينار)

٧ - مشروع طريق العيص-العين البيضاء

الكلفة الكلية مدة التنفيذ	٣٠٠ ١٢ شهرًا ٣٠٠ ٣٠٠ ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨ سير العمل في المشروع الأوامر التغیرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع ملاحظات	٢٠٠٨ تشرين أول ٢٠٠٨ أيار ٢٠٠٨  
المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات.		

(بألف دينار)

٧ - مشروع صيانة الطرق الزراعية

الكلفة الكلية	مدة التنفيذ	مخصصات عام ٢٠٠٨	الانفاق لغاية ٢٠٠٨/١٠/٣١
٢٥٠	١٢ شهراً	١٧٤.٣	
%١٠٠		١٧٤.٣	
%١٠٠			
<p>- عطاء توريد مواد فرشيات بكلفة ١٩.٢٥٠ دينار و مدة التنفيذ (٣٠) يوم ونسبة الإنجاز %١٠٠ .</p> <p>- عطاء توريد مواد فرشيات لطرق زراعية (عابل وادي زيد) ويتضمن فرد المواد وركها ورشها بـ MC ونسبة الإنجاز %١٠٠ .</p> <p>- إعادة إنشاء طريق أم الطافيج وبتكلفة كلية ١٦.٨٠٠ دينار خلال ٤٥ يوم ويتضمن العمل حرث وتسوية .</p> <p>- وضع طبقة فرشيات وركها وأخذ فحوصات مخبرية .</p> <p>- وضع طبقة MC</p> <p>- وضع طبقة ختامية من الحصبة والعدسية ونسبة الإنجاز %١٠٠ .</p> <p>- تعبيد طريق العميا ويتضمن العمل ما يلي :-</p> <ul style="list-style-type: none"> ١- تسوية الطريق وركها ٢- وضع فرشيات وركها ٣- وضع MC ووجه ختامي حصبية وعدسية ٤- بالإضافة إلى مشاريع أخرى تشمل على شق وتعبيد الطرق وهي تسير بشكل جيد وضمن المخطط <p>المشروع يسير بشكل جيد جداً ولا توجد معوقات</p>			
<p>الأوامر التغیریة</p> <p>نسبة الإنجاز مقارنة بالكلفة الإجمالية:</p> <p>تقييم المشروع</p> <p>ملاحظات</p>			
<p>لا توجد %١٠٠</p> <p>خدم هذه المشاريع مزارع وأراضي في محافظة الطفيلة</p>			

(بألف دينار)

٨- مشروع اكمال طريق الطفيلة - الحسا

الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨	٦٩٠٠ ٢٨ شهرًا ٢٥٠٠ ٢٥٠٠ ٪١٠٠ ٪٣١	كانون أول ٢٠٠٨ أيار ٢٠٠٨	 
سير العمل في المشروع الأوامر التغیریة نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالیة: تقييم المشروع ملاحظات :			العمل جارٍ في موقع المشروع ولا يزال المشروع متاخراً بنسبة ٢٠% عن برنامج العمل المعدل المقدم في تشرين ثاني ٢٠٠٧ . تم الإنتهاء من المرحلة الأولى والثانية والعمل الآن جاري في المرحلة الثالثة على أن يتم التسليم في شهر تموز ٢٠٠٩ . لا يوجد ٤٠% من المشروع متاخر بسبب طبيعة تصاريض الموقع.

(بألف دينار)

٩- مشروع إسكان الأسر الفقيرة / المرحلة الثانية

الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨	١٦٧ ٢٠ شهرًا ٢٠٣.٩ ٢٠٣.٩ ٪١٠٠ ٪٨٩	تشرين أول ٢٠٠٨ أيار ٢٠٠٨	 
سير العمل في المشروع الأوامر التغیریة يوجد بعض الأوامر التغیریة في موقع جرف الدراویش.			تم تسليم موقعين من ضمن المشروع هما العيص وبصيرا ، والعمل حالياً مستمر بموقعين هما العین البيضا وجرف الدراویش، بالنسبة إلى موقع العین البيضا منجز بنسبة ٩٩% ، أما موقع جرف الدراویش بلغت نسبة الإنجاز ٩٥%.

<p>نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الإجمالية:</p> <p>المشروع يسير بشكل جيد</p>	<p>تقييم المشروع</p>	<p>ملاحظات</p>
------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------

(بألف دينار)

١٠ - مشروع إنشاء وتحسين الطرق القروية والثانوية

<p>كانتون أول ٢٠٠٨</p> 	<p>٣٠٠ دينار سنوي/مستمر</p> <p>٣١٩.٧</p> <p>٣١٩.٧</p> <p>%١٠٠</p> <p>%١٠٠</p>	<p>الكلفة الكلية ٢٠٠٨ مخصصات عام الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨ :</p> <p>مدة التنفيذ ٢٠٠٨/١٢/٣١ ٢٠٠٨ ٢٠٠٨</p> <p>سير العمل في المشروع .</p> <p>الأوامر التغیریة .</p> <p>نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الإجمالية:</p> <p>تقييم المشروع .</p> <p>ملاحظات .</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(بألف دينار)

١١ - مشروع إنشاء مركز الطفيلة لنوى الاحتياجات الخاصة

<p>كانتون أول ٢٠٠٨</p> 	<p>٣٧١٨</p> <p>٥٤٠ يوماً</p> <p>٧١٨</p> <p>١٨٥.٦</p> <p>%٢٥.٩</p> <p>%١٥</p>	<p>الكلفة الكلية ٢٠٠٨ مخصصات عام الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨ :</p> <p>مدة التنفيذ ٢٠٠٨/١٢/٣١ ٢٠٠٨ ٢٠٠٨</p> <p>سير العمل في المشروع .</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

المركز يتكون من ثلاثة طوابق بمساحة إجمالية (٥١٤٦م^٢) وهو يتكون من غرف الخدمات والصيانة وغرف العلاج والأطباء والأخصائيين الإجتماعيين والعديد من مكاتب الموظفين وقاعة متعددة الأغراض ومطعم وغرف الخدمات الأخرى بالإضافة لخزان ماء وحفرة تجميعية وأعمال خارجية وجدران خارجية وجدران ومساحات إسفلتية

الأوامر التغیریة:

نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:

تقييم المشروع .

- % ١٥

تم البدء بالمشروع في ٢٠٠٨/١١/١٦ وهو الآن يسير بشكل جيد
ونسب إنجاز أعلى من المتوقع.

ملاحظات

(بألف دينار)

١٢ - مشروع إنشاء المدينة الصناعية في الطفيلة

٢٠٠٨ تشرين أول



٨٠٠
٣٦ شهراً
٤٠٠
١٠٠
٪ ٢٥
٪ ٧

الكلفة الكلية
مدة التنفيذ

٢٠٠٨ مخصصات عام
الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨
نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨ :

سير العمل في المشروع

- تم استتمالك الأرض.
 - المخططات والدراسات جاهزة.
 - تم طرح العطاء وتمت الإحالة وبواشر بالتنفيذ في شهر ٢٠٠٧/٩
 - تم انجاز سور المدينة بطول ١٦٥٠ م
 - توجد أوامر تغييرية حول طبيعة الأرض من الجهة الغربية للمدينة وبحاجة إلى تجريف.
- تصل نسبة الإنجاز في مشروع المدينة الصناعية إلى ١٠% وتم انجاز ما نسبته ٣٥% من سور المدينة.
- المشروع يسير دون المستوى المخطط له نتيجة لوجود أوامر تغييرية تحتاج إلى قرارات إدارية.

الأوامر التغیریة

نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:

تقييم المشروع

ملاحظات

(بألف دينار)

١٣ - مشروع إضافات غرف صفية لرياض الأطفال

-
١٢ شهراً
٥٠
٤٥.١
٪ ٩٠
٪ ٨٨

الكلفة الكلية
مدة التنفيذ

٢٠٠٨ مخصصات عام
الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨
نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨ : سير العمل في المشروع.

الأوامر التغیریة:

نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:
تقييم المشروع .

- ١- مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية للبنات
- ٢- فاطمة بنت اليمني الأساسية للبنات
- ٣- رحاب الأساسية المختلطة

لا توجد

٩٨% في جميع المواقع
المشروع يسير بشكل جيد وحسب البرنامج المعد

٧٠ مٌبلغ مساحة كل مبني

ملاحظات

(بألف دينار)

٤ - مشروع طريق الطفيلة الدائرى

الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلى حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨ : سير العمل في المشروع.	١٠٠٠ ٣٦ شهراً ٤٥٠ ٤٤٤.٩ ٩٨.٩ -	تم إرسال كتاب من وزير الأشغال إلى دولة رئيس الوزراء بتاريخ ٢٠٠٨/٩/٢٤ حول هذا المشروع ومن المتوقع إستكمال إجراءات العطاء في شهر تشرين ثاني ٢٠٠٨ والمباشرة في العمل العام القادم . لا توجد -	الأوامر التغيرية: نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع .	ملاحظات
		تم إحالة العطاء على شركة الحنقطة ومن المتوقع أن يتم المباشرة في العمل في بداية شهر ٢٠٠٩/٢	-	

- ملخص لأهم المطالب والاحتياجات:

١. إنشاء مبنى لنادي معلمي محافظة الطفيلة علماً بان قطعة الأرض متوفرة.
٢. إجراء صيانة لعدة مدارس أهمها مدرسة القادسية الثانوية للبنين وبصيراً الأساسية للبنين والحسا الثانوية للبنين القادسية الثانوية للبنات.
٣. إنشاء مديرية تربية وتعليم للبادية.
٤. إنشاء مركز صحي فرعى في منطقة جسر الشهداء.
٥. إنشاء مستشفى حكومي رديف للمستشفى العسكري.
٦. الطريق الدائري لحل مشكلة الشارع الوحيد في مدينة الطفيلة.
٧. إعادة تأهيل الطريق الملوكى.
٨. معالجة وتحسين المنعطفات الخطرة.
٩. تحسين وإنارة مدخل الطفيلة القادم من عمان.
١٠. إقامة مدينة العاب ترفيهية وإقامة المتزهات.
١١. الإسراع في تنفيذ المركز الإيوائي الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة.
١٢. إدراج المحافظة على الخريطة السياحية واستغلال الميزات السياحية في كل من حمامات عفرا ومحمية ضانا.
١٣. تطوير وسط محافظة الطفيلة المحاذية للقلعة
١٤. إعادة تأهيل شبكة الكهرباء.
١٥. إعادة تأهيل شبكة المياه.
١٦. إعطاء الأولوية في تنفيذ سدي شیضم والوادات.
١٧. استكمال ربط باقي أحياء المدينة بشبكة الصرف الصحي.
١٨. إنشاء مراكز شبابية نموذجية في كل من العين البيضاء والقادسية والحسا وبصيراً.
١٩. تكملة درجات ملعب مجمع الطفيلة الرياضي.
٢٠. تخصيص صندوق خاص لتنمية المحافظة.
٢١. العمل على جذب الاستثمارات إلى المحافظة.
٢٢. إقامة منطقة حرة بمنطقة جرف الدراويس.
٢٣. إنشاء مركز ثقافي ومكتبة عامة.
