محافظة عجلون

محافظة عجلون

لمحة عامة



تعتبر محافظة عجلون من أجمل محافظات المملكة وأطلق عليها جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه اسم المحافظة الجميلة، وتتميز محافظة عجلون بالطبيعة الجبلية المتباينة الارتفاع وبتضاريسها الخلابة ومخزونها من الاشجار الحرجية الكثيفة وغابات اللزاب والسنديان وكذلك الطقس المعتدل صيفاً البارد شتاءً حيث يعمل هذا المناخ على جذب السياح على مدار السنة.

التضاريس والمناخ:

يبلغ معدل هطول الأمطار في عجلون (٧٥٠) ملم و معدل درجات الحرارة في فصل الشتاء (٥) درجات ، وفي فصل الصيف (٣٣) درجة وتتميز بتضاريسها المختلفة فهناك المناطق المرتفعة والمناطق المنخفضة (الشفاغورية)حيث تتراوح الارتفاعات بين(١١٨٠)م إلى (٥٩٠) م فوق سطح البحر، الامر الذي وفر للمحافظة تنوعاً في الانتاج الزراعي ، وجمال الطبيعة.

الموقع والمساحة:

تقع محافظة عجلون في الشمال الغربي من المملكة، وتبلغ مساحة المحافظة (٤٢٠) كم٢، مشكلة بذلك ما نسبته (٥٠٠%) من مساحة المملكة، وتعتبر ثاني أصغر محافظات المملكة بعد محافظة جرش.

الواقع السكانى والكثافة السكانية:

الجدول رقم (١) التوزيع السكاني حسب الجنس واللواء والكثافة السكانية في محافظة عجلون

معدل الكثافة	النسبة	المساحة	النسبة من	سكان	عدد ان	اللواء
السكانية	%	کم ۲	المحافظة	مة)	(نسر	
فرد/کم۲			%	اناث	ذكور	
٣٠٤.٨	٧٩.٤	777 <u>1</u> 7	٧٧.٢	٤٩٧١٠	0112.	قصبة عجلون
T { V . 7	۲۰٫٦	٨٦.٤٦	۲۲_۸	1589.	1017.	كفرنجة
٣١٣.٦	١	19.77	١	۱۳۱	٦.,	المجموع

المصدر: - دائرة الإحصاءات العامة، ٢٠٠٧.

التقسيمات الادارية:

عدد الالوية في المحافظة هما لوائين :-

أولا: لواء قصبة عجلون

ثانيا: لواء كفرنجة

الخارطة رقم (١) خارطة محافظة عجلون حسب الألوية والقرى



أبرز المشاريع الرأسمالية لمحافظة عجلون

الملاحظات	نسبة	نسبة	مخصصات	الجهة	اسم المشروع	الرقم
	الإنجاز%			المنفذة		
		٧.٧	V • A Y _ \		مجمــوع المشــاريع	
					الرأسمالية للمحافظة منها	
					المشاريع التالية	
المشـــروع قيـــــد	١.	٨٢	٨٥٠	وزارة	إنشاء أبينة المحاكم	٠,١
الدراسة وإعداد				العدل	وقصور العدل.	
التصاميم.						
تم الانتهاء واستلام	١	١	777	وزارة	إسكان الأسر الفقيرة.	٦.
الوحدات السكنية.				الأشغال		
تم الاستلام الأولي	١	٤٤.٩	١	وزارة	توسعة مستشفى الإيمان.	.٣
للمشروع.				الصحة		
المشروع يسر دون	٣٨	٣٧.٦	٧٥	وزارة	إنشاء سد كفرنجة.	٤.
المستوى المخطط				المياه		
له.				والري		
المشروع مستمر.	١	٨٩.٤	٧.	دائرة	ترميم موقع البدية.	.0
				الأثار		
تـم الانتهاء مـن	١	99.9	717	وزارة	تحسين وتطوير الخدمات	٦.
المشروع.				السياحة	في المواقع السياحية.	
المشروع مستمر.	١	۸۱.۷	٤٠	دائرة	تـــرميم وتعميـــر قلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	٠,٧
				الأثار	عجلون ومار الياس.	
المشـــروع قيـــــد	١	١	٥٢	وزارة	إنشاءات مختلفة وإضافات	٠,٨
التنفيذ.				التربية	غرف صفية.	
المشــروع يســر	٣.	91	10.	وزارة	إنشاء نادي للمعلمين.	٩.
حسب المخطط له.				التربية		
تـم الانتهاء مـن	١	١	۲.,	وزارة	تنفيذ طريق عين جنا-	٠١.
المشــــروع				الأشغال	القاعدة.	
والمشـــروع قيــــد						
التسليم. تـــم الانتهــاء مـــن						
	١	١	٣.,	وزارة	تنفيذ طريق عين جنا-	-11
المشـــروع				الأشغال	عنجرة سوف.	
والمشـــروع قيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ						
الاستلام. المشـــروع يســـير						
المشـــروع يســـير	١	١	۸.۲۷۲	وزارة	صيانة الطرق الرئيسية	٠١٢.
حسب المخطط له.				الأشغال	والنافذة.	

المشروع يسير	١	١	479	وزارة	إنشاء وصيانة الطرق	.17
حسب المخطط له.				الأشغال	الثانوية والقروية.	

خلاصة التقييم لأهم المشاريع التنموية والرأسمالية لمحافظة عجلون

مخصصات النفقات الرأسمالية للمشاريع التنموية في قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٠٨


قدرت النفقات الرأسمالية لمشاريع محافظة عجلون بنحو (٧٠٨٢.٦) ألف دينار موزعة على مختلف القطاعات وحسب الفصول للوزارات والدوائر الحكومية وبلغ حجم الإنفاق الفعلي على هذه المشاريع (٦٤٢٤.٤) ألف دينار مشكلة ما نسبته (٩٠٠٧) من إجمالي المخصصات المقدرة للمحافظة حتى نهاية ٢٠٠٨/١٢/٣١ ، وتعتبر هذه النسبة ضمن المستوى المستهدف ، كما هو واضح في الشكل رقم (١).

(بالألف دينار)

نسبة الإنفاق الفعلي %	الانفاق حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١	مقدر ۲۰۰۸	البيان
۹٠.٧	7 £ 7 £ . £	7 7 7	المشاريع الرأسمالية

المصدر: دائرة الموازنة العامة.


مقارنة الاتفاق الفعلي للمشاريع الرأسمالية حسب القطاعات محافظة عجلون

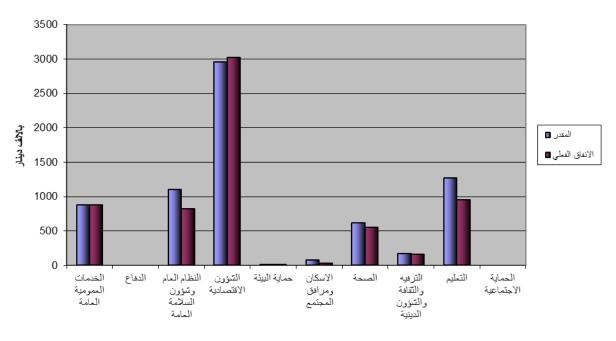

القطاعات

ويه شير توزيع مخصصات المحافظة حسب القطاعات الوظيفية إلى إستئثار قطاع الشؤون الإقتصادية على ما نسبته (٤١٠٧) من إجمالي مخصصات محافظة عجلون لعام ٢٠٠٨ وذلك من أجل تنمية المحافظة إقتصادياً والمساهمة في تخفيض معدلات البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة من مشاريع البنية التحتية ومشاريع تعزيز الإنتاجية وتحفيز الإستثمارات المحلية ، وجاء في المرتبة الثانية قطاع التعليم والذي حاز على ما نسبته (١٧٠٩%) من إجمالي مخصصات المحافظة وتلاه قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة كما هو موضح في الشكل رقم (٢).

شکل رقم (۲)

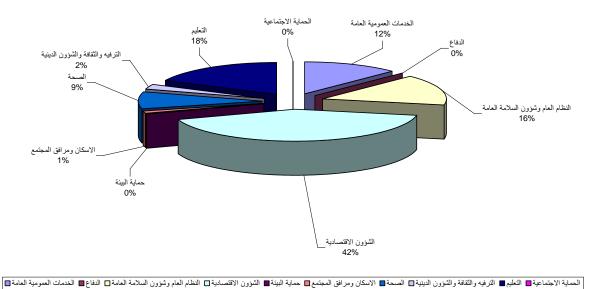

وفي ما يلى تحليل موجز لأهم مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب الفصول:-

الإشغال العامة والإسكان :-

حظيت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالمرتبة الأولى من حيث حجم المخصصات المرصودة للمحافظة، حيث تم رصد مبلغ (٢٩٥٣) ألف دينار مشكلة ما نسبته (٢٠٤١) من إجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة، وتم إنفاق (٢٩٤٩.٢) ألف دينار أي ما نسبته (٩٩٩٠) من المخصصات المرصودة لوزارة الأشغال العامة والإسكان في المحافظة حتى (٩٩٩٠) من المخصصات المرصودة لوزارة الأشغال العامة والإسكان في تنفيذ مشاريع (٢٠٠٨/١٢/٣١) وهي نسبة ضمن المستوى المطلوب وتركزت الأعمال في تنفيذ مشاريع إنشاء وتحسين الطرق القروية والثانوية والطرق الزراعية وتنفيذ طريق عين جنا عنجرة ومشروع الأسر الفقيرة.

التربية والتعليم:-

احتل قطاع التعليم المرتبة الثانية من حيث حجم المخصصات المرصودة وحجم الإنفاق حيث تم رصد مبلغ (١٣٩٦٦) ألف دينار مشكل ما نسبته (١٩٨٨) من إجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة وتم إنفاق (١٠٩٨٣) ألف دينار أي ما نسبته (٢٨٧٨) من المخصصات المرصودة لقطاع التعليم حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١، وتعتبر هذه النسبة دون المستوى المطلوب ويعود السبب إلى عدم تنفيذ بعض المشاريع الإنشائية مثل مشروع نادي للمعلمين .

الصحة :-

بلغ حجم المخصصات المرصودة لقطاع الصحة للمحافظة ما مقداره (٦١٨.٩) ألف دينار مشكلة ما نسبته (٨٠٠) من إجمالي المخصصات للمشاريع الرأسمالية للمحافظة ، تم إنفاق ما مقداره (٥٦.٨) ألف دينار أي ما نسبته (٩٠%) من المخصصات حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١

الزراعة :-

بلغت المخصصات المرصودة لقطاع الزراعة للمحافظة ما مقداره (٤٣٨.٩) ألف دينار مشكلة ما نسبته (٢.٢%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمشاريع الرأسمالية في المحافظة، تم إنفاق (٧٩.٩) ألف دينار أي ما نسبته (١٦.١%) من المخصصات المرصودة لهذا القطاع حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١.

السياحة والآثار:

بلغت المخصصات المرصودة لمشاريع السياحة والآثار (١٣٥) ألف دينار مشكلة ما نسبته (٨٥%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمشاريع الرأسمالية في المحافظة، تم إنفاق (٤١٨) ألف دينار أي ما نسبته (١٠١%) من المخصصات المرصودة لهذا القطاع في المحافظة حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١

وفيما يلى بطاقة وصف لأهم المشاريع التي تم تقييمها:-

ذجية للمحاكم وقصور العدل في المملكة	١- مشروع إنشاء أبنية نمو
٢٧٠٥٠ (لعجلون والزرقاء ومادبا والرصيفة)	الكلفة الكلية:
٣٦ شهراً	مدة التنفيذ:
٠٠٠٠ (لعجلون والزرقاء ومادبا والرصيفة)	مخصصات عام ۲۰۰۸ :
850 (لمحافظة عجلون)	
٧٠٠	الإنفاق الفعلي حتى ٢ ٣/٦ ٢/٨٠ :
%^7.5	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨:
%1.	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
المشروع قيد الدراسة وإعداد التصاميم .	سير العمل في المشروع:
تم الانتهاء من الدراسات وإعداد التصاميم وتمت الإحالة	
المتنفيذ على شركة صرايرة ومن المتوقع صدور أمر	
المباشرة خلال الربع الأول من عام ٢٠٠٩.	
-	الأوامر التغييرية:
%1.	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:
المشروع يسير دون المستوى المخطط له.	تقييم المشروع :

ملاحظات: يهدف المشروع إلى إنشاء مبان حديثة نموذجية مستقلة للمحاكم وقصور العدل في المملكة.

٢- مشروع إسكان الأسر الفقيرة المرحلة الثانية				
بة: ٢٠٠٨	الكلفة الكلي			
۲۶ شهراً	مدة التنفيذ			
عام ۲۰۰۸ لكافة المحافظات	مخصصات			
منها (۷۲۷)لعجلون				
The same of the sa				
YTY				
ق الفعل ي حتى				
	۸/۱۲/۳۱			
	m ks 47 - #			
نفاق من المخصص ١٠٠ %	-			
	: ۲۰۰۸			
باز لعام ۲۰۰۸: ۱۰۰ %				
في المشروع: تم تسليم ما يلي :-	سير العمل			
- إسكان صخرة (١٠) وحدات سكنية /في المراحل النهائية.				
- إسكان كفرنجة (٣٠) وحدة سكنية/في المراحل النهائية.				
- إسكان الوهادنة (١٠) وحدات سكنية/في المراحل النهائية.				
- إسكان عنجرة (١٠) وحدات سكنية/في المراحل النهائية.				
- إسكان عين جنا (١٦) وحدة سكنية/في المراحل النهائية.	الأمام المت			
	الأوامر الت			
دينار وسيتم طرح عطاء لتنفيذ خلطة اسفلتية للطرق . - إسكان عين جنا/ سيتم طرح عطاء خلطة اسفلتية للطرق.				
- إسكان عين جهار سيم طرح عصاء خلطه المعليه للطرق. بجاز مقارنــة بالكلفــة ۹۸%	ייי ג'אויי			
/0 1/1 <u></u>	سبب الاجمالية:			
روع: المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات	روجوب تقييم المشر			
	ملاحظات			

بالألف دينار

بالألف دينار		
سعة مستشفى الإيمان / عجلون	مشروع توس	· - ٣
	٣٠٠	الكلفة الكلية
تشرین أول ۲۰۰۸		
	٣٦ شهراً	مدة التنفيذ
- 44 34	1	مخصصات عام ۲۰۰۸
	٤٤.٩	الإنفاق الفعلي حتى
		۲۰۰۸/۱۲/۳۱
1		
	% ٤ ٤ . 9	نسبة الإنفاق ۲۰۰۸
	%1	نسبة الأنجاز لعام ٢٠٠٨:
لأولي للمشروع بتاريخ ٥/٨/٨٠٠.	تم الاستلام ال	سير العمل في المشروع:
	· -	الأوامر التغييرية
	%١	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة
		الاجمالية
الأولي للمشروع	1	تقييم المشروع
المرصود في الموازنة العامة لعام ٢٠٠٨ لغايات شراء أجهزة	_	
رمستلزمات طبية للطابق الاضافي.		
روع إلى توسعة المبنى القائم بـ (٤٠) سرير إضافي.		ملاحظات:
بمساحة (٢٥٠)م٢ باطني رجال.	- تم التوسعة	

٤- مشروع إنشاء سد كفرنجة				
ح إساء سا تعريب		40		
	771	الكلفة الكلية		
	۲۰ شهراً	مدة التنفيذ		
	٧٥	مخصصات عام ۲۰۰۸		
	۲۸.۲	الإنفاق الفعلي حتى		
		۲۰۰۸/۱۲/۳۱		
	%٣٧.٥	نسبة الإنفاق من المخصص		
		۲۸		
	-	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:		
مرحلة الدراسات وإعداد التصاميم.	المشروع في م	سير العمل في المشروع		
	-	الأوامر التغييرية		
(4	٥% (دراسات	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة		
		الاجمالية		
ِ دون المخطط له.	المشروع يسير	تقييم المشروع		
	-	ملاحظات		

٥- مشروع استكمال توسعة (٢٥) مركز صحي قائم				
٤٧٠٠ لكافة محافظات المملكة .	الكلفة الكلية			
٤٨ شهراً	مدة التنفيذ			
٨٦٠ لكافة المحافظات منها ٣٠ لمحافظة عجلون / مركز صحي	مخصصات عام ۲۰۰۸			
الحسن.				
-	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١			
-	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨			
	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:			
المشروع في مرحلة الطرح والإحالة.	سير العمل في المشروع			
-	الأوامر التغييرية			
-	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية			
المشروع يسير ببطء.	تقييم المشروع			
تم نقل المخصصات	ملاحظات			

ار المار		
وقع البديه-عجلون	شروع ترميم ه	۲- ما
تشرین اول ۲۰۰۸	۲.,	الكلفة الكلية
	۱۲ شهراً	مدة التنفيذ
NAME OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER	٧٠	مخصصات عام ۲۰۰۸
	٦٢.٦	الإنفاق الفعلى حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
The same of the sa	(% ۸٩.٤)	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨
	%1	نسبة الأنجاز لعام ٢٠٠٨:
	/0 • •	
THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY		
THE PARTY OF THE P		
ىن قبل دائرة الأثار العامة.	المشروع ينفذه	سير العمل في المشروع
	-	الأوامر التغييرية
	%١٠٠	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية
یشکل چید	المشروع يسير	تقييم المشروع
بمن (۱۰) سنوات.		ملاحظات
ِ مَن (۱۰) سنوات.	قد يستمر لاحتر	



ملاحظات


بالألف دينار

بالألف دينار		
، عجلون ومار الياس	وتعمير فلعه	۸۔ مشروع ترمیم
كاتون أول ٢٠٠٨	٤٠	الكلفة الكلية
100000	(سنوي)	
	۱۲ شهر	مدة التنفيذ
	٤٠	مخصصات عام ۲۰۰۸
	٣٢.٧	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
	%^\\.\	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
THE RESERVE TO SERVE	%١٠٠	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
of the testing of the content of	· • * 11	سير العمل في المشروع.
مرحلة التنفيذ ، ينفذ من قبل دائرة الأثار العامة	المسروع في	
	-	الأوامر التغييرية .
	%١٠٠	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية
ر حسب ماهو مخطط له.	المشروع يسي	تقييم المشروع .
لترميم وتعمير قلعة عجلون فقط بدون مار الياس	هذا المشروع	ملاحظات .
کثر من (۱۰) سنوات.	وقد يستمر لأ	

بالألف دينار


٩- مشروع إنشاءات مختلفة وإضافات غرف صفية ٤٥٣٠ (لكافة المحافظات) (مستمر) الكلفة الكلية ٥٠٠٠-٨٠٠٠ (للمدارس المذكورة) مدة التنفيذ ٤٥٣٠ لكافة المحافظات مخصصات عام ۲۰۰۸ ٥٢ لمحافظة عجلون 07 الإنفاق الفعلى حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ %1.. نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: %1.. مدارس قيد التنفيذ: مدرسة عبلين ومدرسة قلعة عجلون. سير العمل في المشروع. تم طرح وإحالة العطاء على شركة الهديل للمقاولات لتنفيذ المشروع والاشراف على شركة المنارة. إضافة الأسوار ، أعمال طمم ، زيادة كمية الاسمنت والحديد. الأوامر التغييرية. نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية تم التأخير في التنفيذ وذلك لعدم وجود موافقة على الأوامر تقييم المشروع. التغييرية حيث تمت الموافقة على الأوامر التغييرية بتاريخ ۲۰۰۸/٦/۲۲ وتم تمديد فترة العطاء ويتوقع الانتهاء من

المشروع قريباً.	
الأعمال المتبقية تشمل أعمال خارجية، إكمال أعمال الدهان،	ملاحظات .
أعمال الكهرباء والميكانيك.	

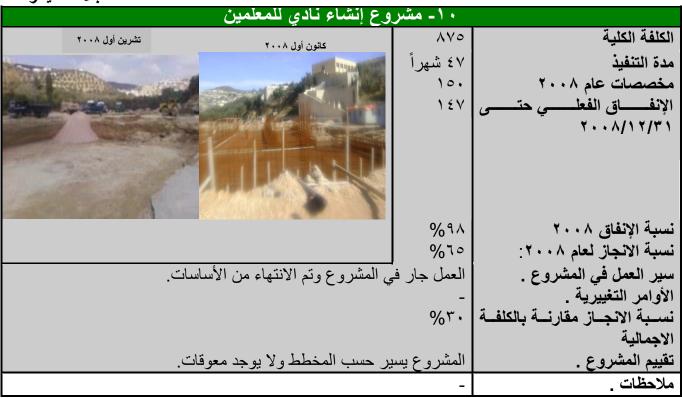

بالألف دينار

١١- مشروع تنفيد طريق عين جنا-عنجرة-القاعدة

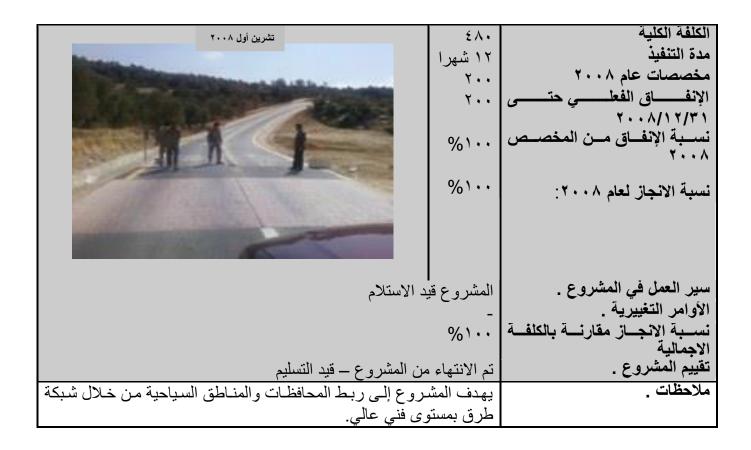

		
١٢-مشروع تنفيذ طريق عين جنا-عنجرة-سوف		
٨٠٠	الكلفة الكلية	
۲۰ شهراً	مدة التنفيذ	
٣٠٠	مخصصات عام ۲۰۰۸	
٣٠٠	الإنفاق الفعلى حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١	
%1	نسبة الإنفاق ٢٠٠٨	
%1	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:	
المشروع في المراحل النهائية من المتوقع التسليم مع نهاية هذا العام.	سير العمل في المشروع .	
-	الأوامر التغييرية .	
%1	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية	
تم الإنتهاء من المشروع	تقييم المشروع .	
يهدف المشروع إلى ربط المحافظات والمناطق السياحية من خلال	ملاحظات .	
شبكة طرق بمستوى فني عالي.		

بالألف دينار



٤١- مشروع إنشاء وصيانة الطرق الثانوية والقروية		
٣٢٩	الكلفة الكلية	
۱۲ شهراً	مدة التنفيذ	
٣٢٩	مخصصات عام ۲۰۰۸	
٣٢٩	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١	
%1	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨	
%1	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:	

سير العمل في المشروع.	تم الإنتهاء من صيانة معظم الطرق التي بحاجة إلى صيانة هذا
الأوامر التغييرية .	العام -
	%1
تقييم المشروع . المشر	المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات.
ملاحظات .	-

١٥- مشروع القرى الحضرية	
Y1	الكلفة الكلية
۲۶ شهراً	مدة التنفيذ
١٠٠٠ تم إجراء مناقلة بكامل المخصص.	مخصصات عام ۲۰۰۸
	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
%·	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨
%·	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
تم تأجيل تنفيذ المشروع لعام ٢٠٠٩	سير العمل في المشروع .
-	الأوامر التغييرية .
-	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية
المشروع يسير دون المستوى المخطط له.	تقييم المشروع .
تم نقل المخصص	ملاحظات .

مطالب واحتياجات محافظة عجلون

- ا. انشاء جامعة حكومية: لتكون هذه المحافظة كباقي محافظات المملكة تشتمل في احضانها على صرح علمي يساهم في تطوير المجتمع المحلي ، وتخفيف الاعباء عن ابنائها الطلبة الدارسين في المحافظات الاخرى ، عدا عن المردود الاجتماعي والاقتصادي والذي يتأتى من انشاء جامعة في أي موقع ، هذا اذا ما علمنا ان النواة لهذه الجامعة متوفرة وتحتاج الى قرار فقط بأن تحول كلية عجلون الجامعية الى جامعة حكومية.
- تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الموقر بخصوص ابراز واشهار اعلان اقليم عجلون السياحي: والذي بدوره سوف يسهم في جذب الاستثمارات السياحية وتشغيل الايدي العاملة ويخفف من نسبة الفقر والبطالة بين ابناء هذه المحافظة.
- 7. انشاء مدينة صناعية: والتي بدورها سوف تسهم في توفير العديد من فرص العمل لابناء المحافظة وتلحقها في ركب التنمية والتطور كباقي محافظات المملكة علماً بأنه قد تم استملاك (١٩١) دونم لصالح مؤسسة المدن الصناعية منذ سنين لهذه الغاية.
 - أ- إعادة ضم اراضي غور الوهادنة وغور فارة الى محافظة عجلون .
- تنفیذ المکرمة الملکیة السامیة بإعادة اعمار مسجد عجلون الکبیر لیکون معلماً دینیاً
 وتاریخیاً وحضاریاً فی منتصف صحن المدینة
- و. إقامة مركز للتدريب المهني التأهيلي للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة من اجل دمجهم في المجتمع ليكونوا عناصر منتجة.
- إنشاء سد على وادي كفرنجة وذلك للحفاظ على مياه الأمطار واستغلالها بالشكل الأمثل خصوصاً ان محافظة عجلون تمتاز بغزارة الموسم المطري فيها.
 - ٧ زيادة عدد المساكن للفقراء حيث ان المحافظة من افقر محافظات المملكة
- ٨. دعم بلديات المحافظة من خلال اعفائها من الديون المستحقة عليها حيث ان جميع البلديات تخلو من أي مشاريع مدرة للدخل.
- ٩. إقامة مبنى لمتصرفية لواء كورنجة حيث أنها مستأجرة وموقعها الحالى غير ملائم امنيا.
 - ١٠. إتمام عملية انشاء المجمع الرياضي وإقامة مدرج وإنارة الملعب الرياضي.
