

محافظة العاصمة

# محافظة العاصمة

## لمحة عامة:



عمان عاصمة المملكة الاردنية الهاشمية. وكانت تسمى ربة عمون التي شادها العمونيون القدماء عاصمة لهم. هي ذات المدينة التي ازدهرت في أيام اليونان والرومان، والتي أطلقوا عليها اسم فيلادلفيا مدينة الحب الأخوي. فيما مضى كانت أبنية المدينة تغطي سبعة تلال، مثلها مثل مدينة روما، أما الآن فان أبنيتها تنتشر على تسع عشرة تله.

تتمتع عمان بثروة من المعالم الأثرية الخالدة. فعلى جبل القلعة الذي كان يتوج المدينة القديمة يرتفع هيكل هرقل، الى جانب متحف الآثار الذي يمكن للزائر أن يشاهد فيه أدوات تمثل حياة الإنسان في العهود القديمة، منذ ما يقارب سبعمئة ألف سنة. أما في الجهة المقابلة لجبل القلعة، فيقوم المدرج الروماني الكبير الذي يتسع لخمسة الألف متفرج.

وبتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الراية تستمر المسيرة المباركة التي بدأها الملك المؤسس عبدالله الأول بن الحسين رحمه الله ثم جلالة الملك طلال بن عبدالله الأول ثم المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراهم لتستمر مسيرة البناء و الإعمار و التقدم و الرخاء.

## التضاريس والمناخ:

لعمان طابع جبلي في اغلبية مناطقها وأحيائها، فترتفع عن سطح البحر قرابة ٧٥٠ مترا وترتفع جبالها (٩١٨) مترا. يمتد أربعة عشر جبلا على طول المدينة وعرضها ومن أهم جبالها: جبل عمان و جبل اللوييدة و جبل الحسين و جبل القلعة و جبل النصر و جبل الأشرفية و جبل الجوفة و جبل النظيف و جبل نزال و الجبل الأخضر وغيرها. وتوجد بين هذه الجبال كثير من الوديان والسهول الواسعة من اهمها وادي السير و وادي صقرة و وادي عبدون و سقف السيل و وادي الرم.

ويسود مدينة عمان مناخ البحر الأبيض المتوسط في معظم مناطق العاصمة حيث المرتفعات بينما يسود بعض مناطقها مناخ شبه صحراوي وخاصة في المناطق الشرقية منها، وبالنسبة

لدرجات الحرارة تكون الدرجة الأعلى في منتصف آب/أغسطس حيث تصل بعض الأحيان ما بين (٣٣-٣٥) درجة مئوية.

## الموقع والمساحة:

مدينة عمّان هي عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية وأكبر مدنها إذ يبلغ عدد سكانها حوالي (٢٢١٦٠٠٠) نسمة، وتبلغ مساحتها مع الضواحي (٧٥٧٩) كيلومتراً مربعاً، وهي المركز التجاري والإداري للأردن. تقع المدينة في وسط المملكة على خط عرض ٣١ شمالاً وخط طول (٣٥) شرقاً، وهي تتكوّن من (١٤) جبلاً تقريباً.

## الواقع السكاني والكثافة السكانية:

بلغ معدل النمو السكاني خلال عامي ٢٠٠٦-٢٠٠٧ حوالي (٢.٣%) وقدر عدد السكان في المحافظة حسب دائرة الإحصاءات العامة لعام ٢٠٠٧ بحوالي (٢٢١٦٠٠٠) نسمة أي ما نسبته (٣٨.٧%) من سكان المملكة ويتوزع هؤلاء السكان على (١٤٧) تجمعاً سكانياً، أهمها قصبة عمان، لواء ماركا، لواء القويسمة، لواء الجامعة، لواء وادي السير، لواء سحاب، لواء الجيزة، لواء الموقر، ولواء ناعور، وتشكل نسبة السكان الذين يقطنون الريف حوالي (٦%) في حين تشكل نسبة الحضر (٩٤%) من إجمالي عدد سكان المحافظة وتبلغ الكثافة السكانية (٢٩٢.٤) شخص/كم<sup>٢</sup> وبلغ عدد الأسر (٤٣٤٥٦٠) أسرة حيث بلغ متوسط حجم الأسرة (٥) أفراد، وفيما يتعلق بتوزيع السكان حسب الجنس فتشير الإحصاءات إلى أن نسبة الذكور تصل إلى (٥١.٤%) ونسبة الإناث (٤٨.٦%) من إجمالي عدد سكان المحافظة والجدول التالي يبين توزيع السكان حسب الجنس واللواء والكثافة السكانية في محافظة العاصمة:-

### الجدول رقم (١)

التوزيع السكاني حسب الجنس واللواء والكثافة السكانية في محافظة العاصمة

معدل الكثافة السكانية فرد/كم <sup>٢</sup>	النسبة %	المساحة كم <sup>٢</sup>	النسبة من المحافظة %	عدد السكان (نسمة)		اللواء
				ذكور	إناث	
١٢٦٥٥	٠.٦	٤٩.٥٦	٢٨.٣	٣٠٣٨٠٠	٣٢٣٤٢٠	قصبة العاصمة
٢٠٧٣	٣.٥	٢٦٦.٨٤	٢٥	٢٦٨٤٩٠	٢٨٤٦٩٠	ماركا
٢٦٤٠	١.٤	١١١.٣٨	١٣.٣	١٤١٨١٠	١٥٢٣٤٠	القويسمة
٢٦٤٣	١.٦	١٢٠.٨١	١٤.٤	١٥٧٤١٠	١٦٢٠٠٠	الجامعة

١٣٧٤	٢	١٤٤.٥٧	٩	٩٨٣.٠٠	١.٠٠٤١.٠	وادي السير
١٣٥	٦.٣	٤٨٢.٧٠	٢.٩	٣.٠٥٧.٠	٣٤٦٤.٠	سحاب
٨٧٩	٧٢.٢	٥٤٦٨.٠٧	٢.٢	٢٢٦٨.٠	٢٥٤٠.٠	الجزيرة
٤٥٧	١.٠	٧٥٠.٧٥	١.٥	١٦٤٢.٠	١٧٩٠.٠	الموقر
٤١٠.٦	٢.٤	١٨٤.٣٩	٣.٤	٣٧١٢.٠	٣٨٦.٠٠	ناعور
٢٩٢.٤	١.٠٠	٧٥٧٩.٠٧	١.٠٠	٢٢١٦.٠٠٠		المجموع

المصدر :- دائرة الإحصاءات العامة، ٢٠٠٧.

### التقسيمات الإدارية:


١. تضم محافظة العاصمة ١٤٧ تجمع سكاني موزعين على ٩ ألوية هي:-
  ١. قسبة عمان.
  ٢. لواء الجامعة.
  ٣. لواء وادي السير.
  ٤. لواء ماركا.
  ٥. لواء الجزيرة.
  ٦. لواء سحاب.
  ٧. لواء القويسمة.
  ٨. لواء ناعور.
  ٩. لواء الموقر.

- الألوية والاقضية التابعة لها :-
  - ❖ لواء الموقر ويضم قضاء الرجم الشامي.
  - ❖ لواء الجزيرة ويضم قضاء ام الرصاص.
  - ❖ لواء ناعور ويضم قضائي ام البساتين وحسبان.



## الخارطة رقم (١)

خارطة محافظة العاصمة حسب الألوية والقرى

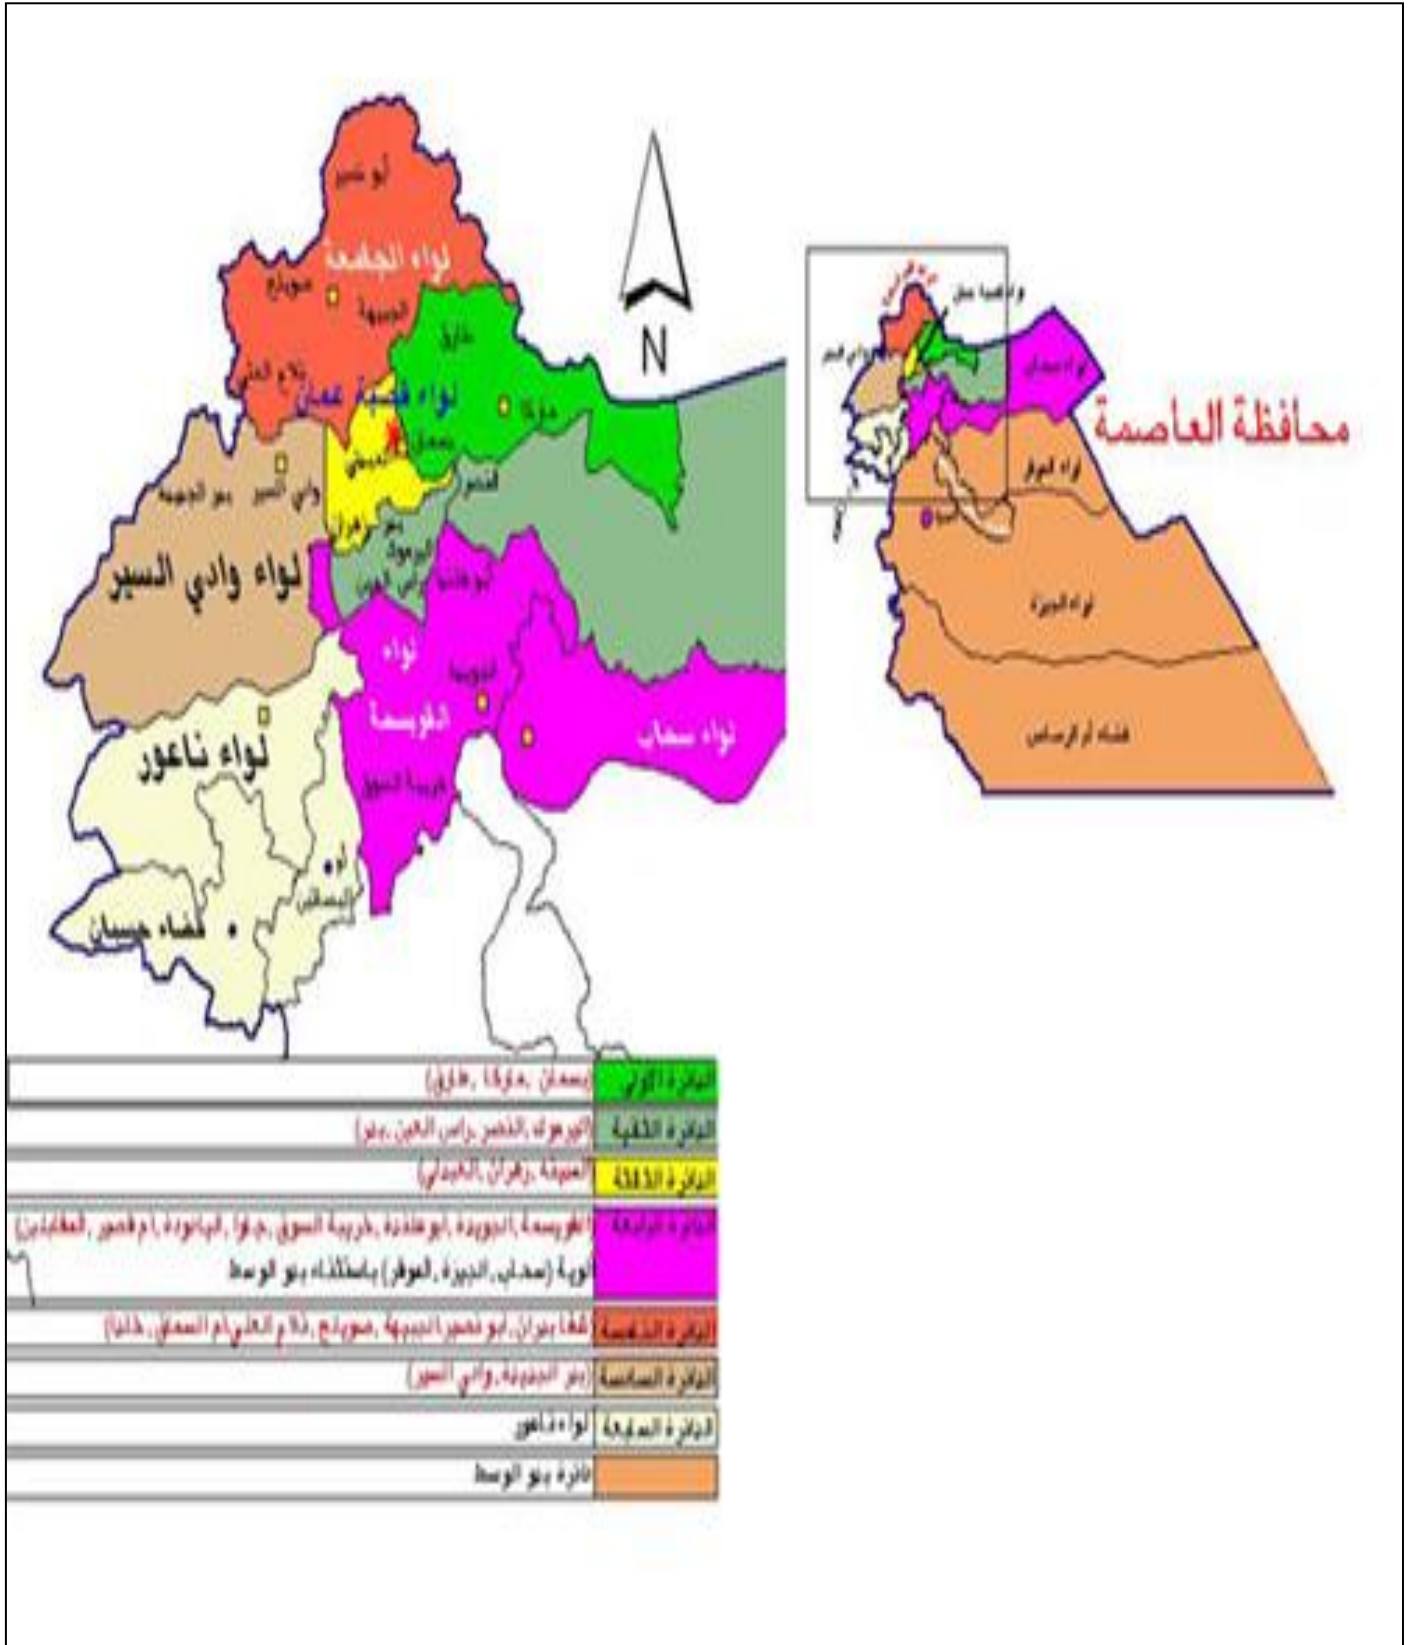



## أبرز المشاريع الرأسمالية لمحافظة العاصمة

(بالآلف دينار)

الرقم	اسم المشروع	الجهة المنفذة	مخصصات ٢٠٠٨	نسبة الإنفاق %	نسبة الإنجاز %	الملاحظات
	مجموع المشاريع الرأسمالية للمحافظة منها المشاريع التالية		٩٤٥٤٤	٨٠		
١.	إسكان الأسر الفقيرة.	وزارة الأشغال	١١٥٥.٤	١٠٠	٩٨	المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات.
٢.	خط سكة حديد عمان / الزرقاء.	وزارة المالية	١٧٠٠٠	٩	٥	المشروع يسير دون المستوى الخطط له.
٣.	طريق عمان الدائري.	وزارة التخطيط	٢٨٩٥٢	٩٩.٨	٤٣.٧	العمل جارٍ في موقع المشروع.
٤.	توسعة مستشفى البشير.	وزارة التخطيط	١٠٠٣٢	٩٩.٧	٣٣.٥	العمل جارٍ في موقع المشروع.
٥.	إكمال طريق أم البساتين/أم العمدة.	وزارة الأشغال	١٠٠٠	١٠٠	٤٠	العمل جارٍ في موقع المشروع.
٦.	إكمال طريق الجويذة/الموقر.	وزارة الأشغال	١٥٠٠	١٠٠	٩٠	العمل جارٍ في موقع المشروع.
٧.	إكمال طريق مطار الملكة علياء الدولي / المرحلة الثانية.	وزارة الأشغال	٦٠٠٠	١٠٠	١٠	العمل جارٍ في موقع المشروع.
٨.	الجيزة / الذهبية.	وزارة الأشغال	-	-	-	المشروع في مرحلة الدراسات وإعداد التصاميم ويسير دون المستوى المخطط له وتم نقل جميع مخصصات المشروع لمشاريع أخرى
٩.	القرى الحضرية.	وزارة الأشغال	-	-	-	المشروع في مرحلة الدراسات وإعداد التصاميم ويسير دون المستوى المخطط له وتم نقل جميع مخصصات المشروع لمشاريع أخرى
١٠.	استكمال (١٨) مركز صحي أولي/ مركز صحي العال.	وزارة الصحة	٨٤.٥	١٠٠	١٠٠	تم الانتهاء من المشروع وتم استلامه أولاً.
١١.	إنشاء مستشفى الأمير حمزة/عمان الكبرى.	وزارة التخطيط	١٠٩٥	٩٧.٧	١٠٠	تم الانتهاء من المشروع وتم استلامه بشكل نهائي



١٢.	توسعة مركز الملكة علياء لأمراض القلب.	وزارة الصحة	-	-	١٠٠	تم الانتهاء من المشروع وتم استلامه بشكل نهائي وتم نقل جميع مخصصات المشروع لمشاريع أخرى
١٣.	إنشاء مستشفى الأطفال.	وزارة التخطيط	٦٦٠٠	٩٩.٣	٨٤	العمل جارٍ في موقع المشروع.

(بالآلاف دينار)

الرقم	اسم المشروع	الجهة المنفذة	مخصصات ٢٠٠٨	نسبة الإنفاق %	نسبة الإنجاز %	الملاحظات
١٤.	نظام تبريد لقصر العدل.	وزارة العدل	١٥٠٠	-	١٠	تم طرح العطاء وتمت إحالته والمشروع يسير دون المستوى المخطط له بسبب التأخر في طرح وإحالة العطاء.
١٥.	إنشاء مبنى متصرفية لواء ناعور وسكن المتصرف.	وزارة الداخلية	٢٠٠	-	١٠	تم طرح العطاء وتمت إحالته والمشروع يسير دون المستوى المخطط له بسبب التأخر في طرح وإحالة العطاء.
١٦.	إنشاء مبنى متصرفية لواء الجامعة وسكن المتصرف.	وزارة الداخلية	-	-	-	تم تأجيل المشروع لعام ٢٠٠٩ وتم إجراء مناقلات يكامل المخصص لمشاريع أخرى
١٧.	إنشاء مبنى متصرفية لواء سحاب وسكن المتصرف.	وزارة الداخلية	-	-	-	تم تأجيل المشروع لعام ٢٠٠٩ وتم إجراء مناقلات يكامل المخصص لمشاريع أخرى

## خلاصة التقييم لأهم المشاريع التنموية والرأسمالية لمحافظة العاصمة

### مخصصات النفقات الرأسمالية للمشاريع التنموية في قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٠٨

بلغت مخصصات المشاريع الرأسمالية لمحافظة العاصمة (٩٤٥٤٤) ألف دينار لعام ٢٠٠٨ موزعة على القطاعات وحسب الفصول للوزارات والدوائر الحكومية في حين بلغ الإنفاق

الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ (٧٥٦٦٤.٢) ألف دينار أي ما نسبته (٨٠%) كما هو واضح في الشكل رقم (١).


### بالآلف دينار

البيان	مقدر ٢٠٠٨	الانفاق حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١	نسبة الإنفاق الفعلي %
المشاريع الرأسمالية	٩٤٥٤٤	٧٥٦٦٤.٢	٨٠

المصدر: دائرة الموازنة العامة، ٢٠٠٨.


الشكل رقم (١)

مقارنة الاتفاق للمشاريع الرأسمالية حسب القطاعات لمحافظة عمان

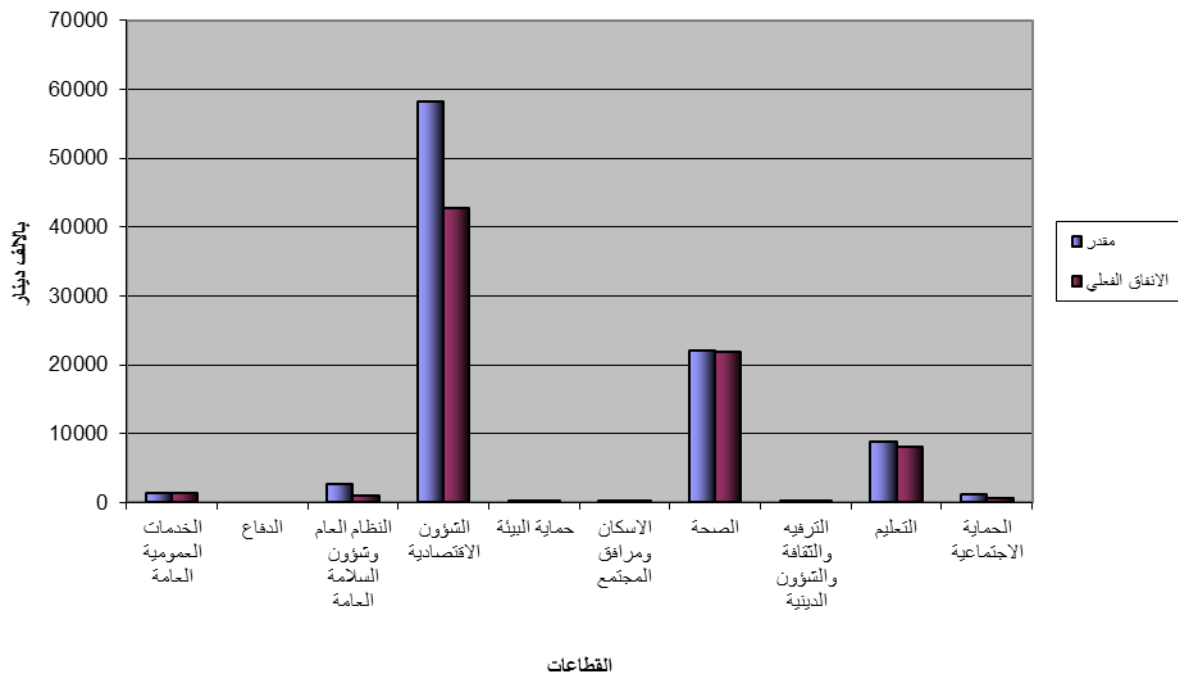

ويشير توزيع المخصصات المالية لمحافظة العاصمة حسب القطاعات الوظيفية إلى أن قطاع الشؤون الاقتصادية استأثر على ما نسبته (٦١.٧%) من إجمالي مخصصات محافظة العاصمة لعام ٢٠٠٨ وذلك من أجل تنمية المحافظة إقتصادياً والمساهمة في تخفيض معدلات البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة من مشاريع البنية التحتية ومشاريع تعزيز الإنتاجية وتحفيز الإستثمارات المحلية ، ويأتي في المرتبة الثانية قطاع الصحة والذي حاز على ما نسبته (٢٣.٣%) من إجمالي مخصصات محافظة العاصمة وتلاه قطاع التعليم كما هو واضح في الشكل رقم (٢) .

#### التوزيع القطاعي للنققات الرأسمالية لمحافظة العاصمة

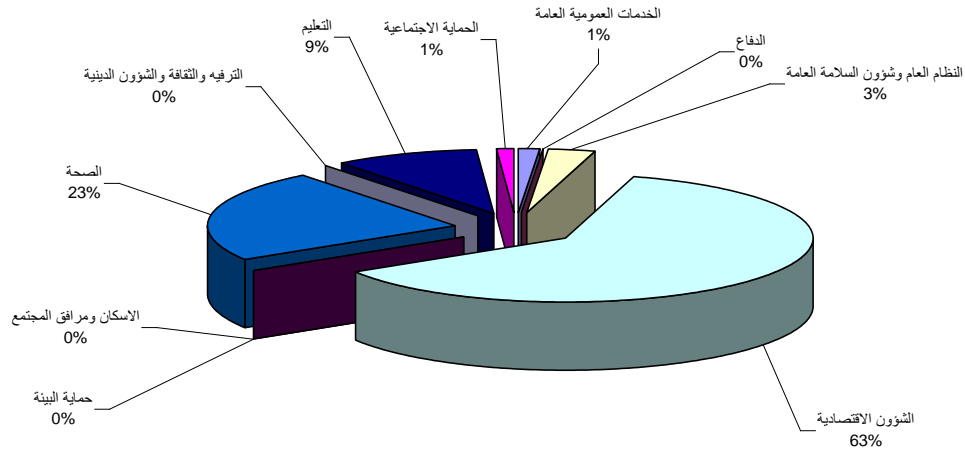

■ الخدمات العمومية العامة ■ الدفاع ■ النظام العام وشؤون السلامة العامة ■ الشؤون الاقتصادية ■ حماية البيئة ■ الاسكان ومرافق المجتمع ■ الصحة ■ الترفيه والثقافة والشؤون الدينية ■ التعليم ■ الحماية الاجتماعية

#### وفي ما يلي تحليل موجز لأهم مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب الفصول:- وزارة الأشغال العامة والإسكان:-

تم تخصيص (١٢٣٢٣.٦) الف دينار مشكلة ما نسبته (١٣%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة وتم انفاق (١٢٣١٩.٥) الف دينار اي ما نسبته (٩٩.٩٧%) من المخصصات المرصودة لوزارة الأشغال العامة والإسكان حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١.

#### التربية والتعليم :-

تم تخصيص مبلغ (٨٤٨٢.٤) الف دينار لوزارة التربية والتعليم في محافظة العاصمة مشكله ما نسبته (٩%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة حيث تم انفاق (٨٠٢٨) الف دينار اي ما نسبته (٩٤.٦%) من المخصصات المرصودة للوزارة حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ وهي نسبة ضمن المستوى المستهدف للإنفاق في مثل هذا الوقت من السنة.

#### وزارة الصحة :-

تم تخصيص مبلغ (٤٣٣٠) الف دينار لوزارة الصحة في محافظة العاصمة مشكله ما نسبته (٤.٦%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة حيث تم انفاق (٤٢١٩.٥) الف دينار اي ما نسبته (٩٧.٤%) من المخصصات المرصودة للوزارة حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ وهي ضمن المستوى المستهدف للإنفاق ومعظم المخصصات المرصودة في المحافظة عبارة عن نفقات

مستمرة لشراء اجهزة ومعدات طبية للمستشفيات والمراكز الصحية و لتحديث الاجهزة وصيانتها لرفع كفاءة الجهاز الطبي .

### وزارة التخطيط والتعاون الدولي/المجلس القومي للتخطيط:-

- تم تخصيص (٤٦٦٧٧.٨)الف دينار مشكلة ما نسبته (٤٩.٣%) من اجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة وتم انفاق (٤٦٥٣٠)الف دينار اي ما نسبته (٩٩.٧%) من المخصصات المرصودة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ ومعظم هذه المشاريع تتركز في قطاع الصحة وقطاع الطرق المتمثلة في مشروع مستشفى الاطفال ومستشفى الامير حمزة وتوسعة مستشفى البشير ومشروع طريق عمان الدائري.

وفيما يلي بطاقة وصف لأهم المشاريع التي تم تقييمها:-

بالألف دينار

١- مشروع اسكان الأسر الفقيرة		
 <p>تشرين أول ٢٠٠٨</p>	٢٢٥٠٠	الكلفة الكلية:
	٢٤ شهراً	مدة التنفيذ:
٨٠٠٠ لكافة المحافظات منها	٢٠٠٨ : مخصصات عام	
١١٥٥.٤	لمحافظ العاصمة	
١١٥٥.٤	الإنفاق الفعلي حتى	
	٢٠٠٨/١٢/٣١:	
١٠٠%	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨:	
١٠٠%	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:	
تم الإستلام الأولي للمواقع التالية :-		سير العمل في المشروع



<ul style="list-style-type: none"> <li>- إسكان الأسر الفقيرة ناعور (١٦) وحدة نسبة الانجاز ١٠٠%</li> <li>- إسكان الأسر الفقيرة القويسمة (٢٠) وحدة نسبة الانجاز ١٠٠%</li> <li>- إسكان الأسر الفقيرة الموقر (٢٦) وحدة نسبة الانجاز ١٠٠%</li> <li>- إسكان الأسر الفقيرة سحاب (٢٦) وحدة نسبة الانجاز ١٠٠%</li> <li>- إسكان الأسر الفقيرة الجامعة - شفا بدران (٣٠) وحدة/ العمل جارٍ في موقع المشروع ، نسبة الانجاز ٣٥%</li> <li>- إسكان الأسر الفقيرة ماركا (٢٦) وحدة / قيد الإستلام الأولي نسبة الانجاز ١٠٠%</li> </ul>	<p>الأوامر التغييرية : نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع :</p>
<p>المشروع يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات.</p>	<p>ملاحظات :</p>

### بالآلف دينار

٢- مشروع خط سكة حديد عمان - الزرقاء	
٦٨٠٠٠	الكلفة الكلية :
٤٨ شهر	مدة التنفيذ:
١٧٠٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٨ :
١٥٠٠	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ :
٩%	نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨:
٥%	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
تم توقيع إتفاقية بناء وتشغيل مشروع خط السكة بين مدينتي عمان والزرقاء مع شركة الإئتلاف الكويتي الإسباني (أكنان جلوبل) بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٣١، ومن المتوقع أن تقوم الشركة بتنفيذ المشروع في الربع الأول من عام ٢٠٠٩.	سير العمل في المشروع:
-	الأوامر التغييرية :
٥%	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية::
المشروع يسير دون المستوى المخطط له.	تقييم المشروع :
	ملاحظات :

### بالآلف دينار

٣- مشروع طريق عمان الدائري	
١١٧٠٠٠	الكلفة الكلية
تشرين أول ٢٠٠٨	
أيار ٢٠٠٨	

 <p>2008/10/29</p>	 <p>2008/10/29</p>	<p>٤٨ شهراً (٢٨٩٥٢) خزينة وقروض ٢٨٩٠٠  %٩٩.٨ %٨٧</p>	<p>مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨  الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:</p>
<p>المشروع قيد التنفيذ وهو على ٣ أجزاء: - الجزء الثالث والثاني تمت إحالته في شهر ٢٠٠٦/٨ - الجزء الأول - تمت إحالته في شهر ٢٠٠٨/٢ حدثت أوامر تغييرية بتمديد فترة تنفيذ العطاء ومن المتوقع الإنتهاء من تنفيذ المشروع في نهاية عام ٢٠١٠ - الجزء الأول ٨% - الجزء الثاني ٥٧% - الجزء الثالث ٦٦% المشروع يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات للجزء الثاني والثالث أما الجزء الأول فهناك تدني في نسبة الإنجاز بسبب تباطؤ المقاول من إنجاز الأعمال المستهدفة .</p>		<p>سير العمل في المشروع:  الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع</p>	
<p>يهدف المشروع إلى إنشاء طريق يصل بين طريق مطار الملكة علياء الدولي ومدينة الزرقاء بطول ٤٠ كم بالإضافة إلى إنشاء ميناء بري ومبنى جديد لجمرك عمان .</p>		<p>ملاحظات:</p>	

بالالف دينار

<p>٤- مشروع توسعة مستشفى البشير</p>			
<p>أيار ٢٠٠٨</p>	<p>كانون أول ٢٠٠٨</p>	<p>٤٠٠٠٠</p>	<p>الكلفة الكلية</p>

	<p>مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإفناق الفعلي حتى ١٠٠٠٦ ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإفناق ٩٩.٧% ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ١٠٠% ٢٠٠٨:</p>	
<p>المشروع قيد التنفيذ وهو على مرحلتين: - المرحلة الثانية: مبنى الخدمات تمت المباشرة الفعلية بتاريخ ٢٠٠٧/٨/١ ومن المتوقع الإنتهاء منه بتاريخ ٢٠٠٩/١١/٤ بمساحة ١٨٤٧٠م<sup>٢</sup>. - المرحلة الثالثة: مبنى الباطنية والجراحة العامة: تمت المباشرة الفعلية بتاريخ ٢٠٠٧/٩/١٥ ومن المتوقع الإنتهاء من هذه المرحلة بتاريخ ٢٠١٠/١١/٢٣ بمساحة ٤٨٦٠٠م<sup>٢</sup> - تم تمديد ٩٥ يوم للمرحلة الثانية - مبنى الخدمات - تم تمديد ٦٥ يوم للمرحلة الثالثة - مبنى الباطنية والجراحة العامة</p>	<p>سير العمل في المشروع  الأوامر التغييرية</p>	<p>نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع</p>
<p>المشروع يسير بنسب أعلى من المستوى المخطط له ولا توجد معوقات. يهدف المشروع إلى إجراء توسعة لمستشفى البشير تتضمن إنشاء مباني وطوابق (لمبنى الخدمات، مبنى الجراحة العامة والباطنية)</p>	<p>ملاحظات</p>	

بالآلف دينار

٥- مشروع إكمال طريق أم البساتين - أم العمد (تقاطع أم البساتين)		
 <p>كاتبون أول ٢٠٠٨</p>	٢١٠٠٠	الكلفة الكلية
	٢٤	مدة التنفيذ
	شهرًا	مخصصات عام ٢٠٠٨
	١٠٠٠	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
	١٠٠٠	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨
	%١٠٠	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
	%٧٥	سير العمل في المشروع
العمل مستمر على أرض الواقع	-	الأوامر التغييرية
	%٤٠	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:
يسير حسب المخطط ولا يوجد معوقات		تقييم المشروع
		ملاحظات

بالآلف دينار

٦- مشروع إكمال طريق الجودة - الموفر		
 <p>كاتبون أول ٢٠٠٨</p>	٢٥٠٠	الكلفة الكلية
	٣٦	مدة التنفيذ
	شهرًا	مخصصات عام ٢٠٠٨
	١٥٠٠	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
	١٥٠٠	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨
	%١٠٠	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
	%٩٠	سير العمل في المشروع
المشروع قيد التنفيذ والعمل مستمر على أرض الواقع		الأوامر التغييرية
صدرت أوامر تغييرية لإضافة تقاطعات عدد (٢)		نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:
%٩٠		تقييم المشروع
المشروع يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات .		ملاحظات

بالآلف دينار

٧- مشروع إكمال طريق مطار الملكة علياء الدولي / المرحلة الثانية		
 <p>كاتبون أول ٢٠٠٨</p>	٧١٠٠٠	الكلفة الكلية
	٤٨	مدة التنفيذ
	شهرًا	مخصصات عام ٢٠٠٨
	٦٠٠٠	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
	٥٩٩٩	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨
	%١٠٠	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
	%١٠	سير العمل في المشروع .
المشروع في مرحلة إزالة العوائق وأعمال الحفر حيث تمت		



المباشرة بتاريخ ٢٠٠٨/١٠/٥	الأوامر التغييرية . نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع .
- ١٠% المشروع يسير حسب المخطط له.	ملاحظات .
يهدف المشروع إلى إنشاء طريق حيوي يرتبط بمشروع المطار الجديد بإنشاء طرق خدمة وتوسعة الطريق القائمة	

### بالآلف دينار

٨- مشروع الجيزة - الذهبية	
٢٥٠٠٠ ٣٦ شهراً ١٥٠٠ تم نقل جميع مخصصات المشروع لمشاريع أخرى	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨
- - - المشروع في مرحلة الدراسات وإعداد التصاميم - - المشروع لا يسير حسب المخطط له	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع. الأوامر التغييرية: نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع .
يهدف المشروع إلى ربط مشروع الإسكان الجديد مع طريق عمان الدائري بشبكة طرق بمساحة ٢٣ كم (أربع مسارب)	ملاحظات

### بالآلف دينار

٩- مشروع القرى الحضرية	
٢١٠٠٠ لكافة المحافظات ١٢ شهراً ١٢٠٠٠ لكافة المحافظات منها ١٠٠٠ لمحافظة العاصمة، تم إجراء مناقلات مالية لمشاريع أخرى	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨
- - المشروع في مرحلة الدراسات وإعداد التصاميم. - - المشروع لا يسير حسب المخطط له.	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع. الأوامر التغييرية: نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:: تقييم المشروع .

يهدف المشروع إلى إنشاء حدائق نموذجية في مختلف محافظات المملكة

ملاحظات

بالألف دينار

### ١٠ - مشروع إستكمال إنشاء (١٨) مركز صحي أولي

<p>تشيرين أول ٢٠٠٨</p>  <p>2008/10/29</p>	<p>٦٥٠٠ منها ٢٥٣ لمركز العال ١٢ شهراً ٨٤.٥ ٨٤.٥ (لمركز صحي العال)</p>	<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨</p>
<p>تم الانتهاء من المشروع وتم استلامه أولياً .</p>	<p>سير العمل في المشروع. الأوامر التغييرية: نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع .</p>	<p>١٠٠% ١٠٠% ١٠٠%</p>
<p>يهدف المشروع إلى خدمة التجمع السكاني في منطقة العال في لواء ناعور</p>		<p>ملاحظات</p>

بالألف دينار

### ١١ - مشروع إنشاء مستشفى الأمير حمزة/عمان الكبرى

٥١٠٠٠

الكلفة الكلية

<p>مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع.</p>	<p>٢٠٠٨-١٩٩٩ ١٠٩٥ خزينة وقروض ١٠٧٠ %٩٧.٧ %١٠٠ تم إستلامه بشكل نهائي (وتم شراء أجهزة ومعدات مختلفة للمستشفى). - %١٠٠ المشروع يسير حسب المخطط ولا توجد معوقات .</p>
<p>الأوامر التغييرية: نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع .</p>	<p>ملاحظات</p>
<p>يهدف المشروع إلى إنشاء مستشفى بسعة (٤٠٠) سرير قابل للتوسع إلى (٥٠٠) سرير مع ملاحظة أن العمل جاري لإنشاء وحدة أعصاب جديدة في المستشفى</p>	

### بالآلف دينار

#### ١٢ - مشروع توسعه مركز الملكه علياء لامراض القلب

<p>الكفه الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع. الاورام التغييرية: نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع .</p>	<p>٦٠٠٠ ٢٠٠٨-١٩٩٩ ٥٠ تم إجراء مناقلة بالمبلغ - - - تم الإنتهاء من المشروع، وتم إستلامه بشكل نهائي - %١٠٠ تم إستلام المشروع .</p>
<p>ملاحظات</p>	<p>يهدف المشروع إلى إنشاء مبنى بمساحة ٨٣٠٠م<sup>٢</sup> يتسع لـ (٧٠) سرير</p>

### بالآلف دينار

#### ١٣ - مشروع إنشاء مستشفى الاطفال

<p>الكفه الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع.</p>	<p>٣٢٠٠٠ ٢٠٠٩-٢٠٠٣ ٦٦٠٠ ٦٥٥٤ %٩٩.٣ %١٠٠</p>
<p>المشروع قيد التنفيذ والعمل جارٍ في موقع المشروع ومن المتوقع الإنتهاء من المشروع خلال شهر آذار ٢٠٠٩.</p>	<p>المشروع قيد التنفيذ والعمل جارٍ في موقع المشروع ومن المتوقع الإنتهاء من المشروع خلال شهر آذار ٢٠٠٩.</p>

-	الأوامر التغييرية: نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع .
٨٤% المشروع يسير حسب المخطط المعدل ولا توجد معوقات	
يهدف المشروع إلى إنشاء مستشفى بسعة (٢٠٠) سرير بالإضافة لإنشاء مبنى طوارئ في حرم مدينة الحسين الطبية	ملاحظات

بالآلف دينار

#### ١٤- مشروع نظام تبريد لقصر العدل

١٨٠٠	الكلفة الكلية
١٢ شهراً	مدة التنفيذ
١٥٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٨
-	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
-	نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨
-	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع.
تم طرح العطاء وتمت إحالته في شهر تشرين الأول لعام ٢٠٠٨ وتم تسليم الموقع للمقاول للتنفيذ.	الأوامر التغييرية: نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع .
-	ملاحظات
٥% المشروع يسير دون المستوى المخطط له	
يهدف المشروع إلى تركيب نظام تبريد وتكييف حديث لقصر العدل	

بالآلف دينار

#### ١٥- مشروع إنشاء مبنى متصرفيه لواء ناعور وسكن المتصرف

٧٠٠	الكلفة الكلية
٣٦ شهراً	مدة التنفيذ
٢٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٨
-	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
-	نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨
-	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع.
تم طرح العطاء وتمت إحالته بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/١٤.	الأوامر التغييرية: نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع .
-	ملاحظات
١٠% المشروع يسير دون المستوى المخطط له بسبب تأخر في طرح وإحالة العطاء	
-	

بالآلف دينار

#### ١٦- مشروع إنشاء مبنى متصرفية لواء الجامعة وسكن المتصرف

٧٠٠	الكلفة الكلية
٢٠١٠-٢٠٠٨	مدة التنفيذ

٢٠٠ (تم إجراء مناقلة من المشروع لمشاريع أخرى)	مخصصات عام ٢٠٠٨
-	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
-	نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨
تم تأجيل المشروع لعام ٢٠٠٩	سير العمل في المشروع.
-	الأوامر التغييرية:
-	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:
متعثر لا يسير حسب المخطط له.	تقييم المشروع .
-	ملاحظات

بالألف دينار

### ١٧- مشروع إنشاء مبنى متصرفية لواء سحاب وسكن المتصرف

٧٠٠	الكلفة الكلية
٢٠٠٨-٢٠١٠	مدة التنفيذ
٢٠٠ تم إجراء مناقلة لمشاريع أخرى	مخصصات عام ٢٠٠٨
-	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
-	نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨
تم تأجيل المشروع لعام ٢٠٠٩	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
-	سير العمل في المشروع.
-	الأوامر التغييرية:
المشروع متعثر لا يسير حسب المخطط	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية::
-	تقييم المشروع .
-	ملاحظات

### مطالب واحتياجات الأولوية في محافظة العاصمة

١. استملاك قطعة ارض لبناء مدرسة أساسية في منطقة دابوق.
٢. بناء مدارس أساسية وثانوية حديثة ومجهزة.
٣. إنشاء اسوار حماية للمدارس غير المسوره مثل مدرسة الخشافية الاساسيه.
٤. إنشاء مدرسة أساسيه في منطقة الموقر الحي الشرقي ومنطقة الهاشمية ومنطقة رجم الشامي الشرقي.
٥. إضافة غرف صفيه في مدرسة الذهيبه الغربيه الثانويه ومدرسة سالم الأساسية المختلطة ومدرسة المنشية الثانويه للبنات ومدرسة اللسين الأساسية ومدرسة النقيرة الثانويه للبنات ومدرسة رجم الشامي الشرقي الأساسية ومدرسة الحاتميه الأساسية ومدرسة الفيصليه الثانويه للبنات ومدرسة الزميلات الأساسية المختلطة ومدرسة الموقر الأساسية للبنين.
٦. صيانة مدرسة الجويده وإنشاء سور وصيانة مدرسة يافا الأساسية للبنات.
٧. إنشاء وتنفيذ العديد من الأبنية المدرسية المطروحة .

٨. صيانة مدرسة ضاحية إسكان القويسمة المختلطة.
٩. إنشاء مختبرات كيميائية في مدرسة النقيرة الثانوية للبنين ومدرسة ام بطمه الثانوية للبنات.
١٠. ربط مناطق شفا بدران وصويلح وتلاع العلي والجبيهة وابو نصير بشبكة الصرف الصحي.
١١. إنشاء شبكة للصرف الصحي لبلدة ناعور وتحديث شبكات المياه في قرى اللواء والاهتمام والمتابعة بمواقع عيون المياه والآبار الارتوازية.
١٢. الإسراع في تنفيذ محطة التنقية في الجيزة وحل مشكلة المياه في مخيم الطالبية.
١٣. العمل على زيادة السدود المائية.
١٤. تحديث شبكة المياه في بعض المناطق مثل الرامة وطور الحشاش.
١٥. إيصال المياه لمناطق الماجدية والرحمانية والرابية ومعالجة الضعف في ضخ المياه لمختلف المناطق.
١٦. توفير أسلامه المرورية على شارع الحزام بإقامة جسور مشاه.
١٧. الاهتمام بالشواخص والإشارات الإرشادية والمرورية على الطريق الدولي (عمان/سحاب).
١٨. دراسة موقع سحاب الشرقي على شارع الستين ووضع الحلول المناسبة له بحيث تكفل الحفاظ على مستخدمي الطرق.
١٩. دراسة إمكانية عمل مسارب تسارع وتباطؤ على شارع الستين موازية لمدخل الشوارع الفرعية على هذا الشارع.
٢٠. تنفيذ وتحسين تقاطعات الطرق النافذة.
٢١. إعادة إنشاء الطريق الرئيسي الذي يربط قضاء أم الرصاص بالصحراوي.
٢٢. إعادة إنشاء وتوسعة الطريق الواصل ما بين رجم الشامى الغربي والهاشمية.
٢٣. تكملة إنشاء وتعبيد الطريق المؤدي إلى منطقة الرابية.
٢٤. تحويل طريق المغاير-المنشية-النقيرة إلى قروي وإعادة إنشائه.
٢٥. حل مشكلة التقاطعات على الشارع الدولي في مناطق الفيصلية والنقيرة.
٢٦. الإسراع في إنارة الطريق الدولي.
٢٧. إنشاء مستشفى في لواء الجيزة وتزويد المراكز الصحية بسيارات إسعاف إضافية
٢٨. تحويل الكثير من المراكز الصحية الأولية إلى مراكز شاملة وتوفير أطباء اختصاص دائمين فيها.
٢٩. توسعة مستشفى الدكتور جميل التوتنجي ورفده بالكوادر الطبية المدربة والمؤهلة المتخصصة وتزويده بالمعدات والأجهزة الطبية اللازمة.
٣٠. ترفيع مركز صحي أم الرصاص إلى مركز صحي شامل.
٣١. بناء مستشفى في منطقة الموقر لاسيما وان المنطقة تشهد زيادة سكانية ملحوظة وكثرة المنشآت الصناعية ومرور الطريق الدولي في اللواء ووجود المركز الدولي لتدريب الشرطة ومركز إصلاح وتأهيل الموقر.

٣٢. توسعة مراكز رجم الشامي الغربي والفيصلية والذهبية الغربية وتحويلها إلى مراكز صحية شاملة.
٣٣. بناء مركز صحي متوسط عند مثلث الزميلات يخدم المناطق المجاورة (الفيصلية، الزميلات، الذهبية الشرقية، النقيرة).
٣٤. رفد المراكز الصحية الشاملة بالأطباء المتخصصين بشكل دائم.
٣٥. انشاء مركز صحي في ضاحية الحاج حسن.
٣٦. توفير مختبر زراعي في مديرية زراعه الجيزه وتأمينه بالكادر الوظيفي.
٣٧. زيادة المساحات الخضراء وخاصة على الطريق الصحراوي.
٣٨. دعم المزارعين ومربي الماشية بما يكفل وصول الدعم لمُسْتَحْقِيهِ ضمن الآليات المناسبة.
٣٩. تطوير مشاريع الحصاد المائي وعمل سدود وحفائر في المناطق الشرقية من المحافظة.
٤٠. إنشاء مكتب بريد في قضاء رجم الشامي.
٤١. توسيع مظلة صندوق المعونة الوطنية لتشمل عدد اكبر من الفقراء والمحتاجين.
٤٢. تخصيص قطعة ارض جديدة لاستخدامها كمقبرة لأهالي منطقة شمال عمان.
