

محافظة معان



# محافظة معان

## لمحة عامة:



محافظة معان هي أكبر المحافظات في المملكة من حيث المساحة وتمتاز المحافظة بمجموعة من الخصائص الحيوية والميزات الإستراتيجية في الموارد والثروات الطبيعية، وتعد المحافظة مستودعاً للموارد الطبيعية الوطنية مثل الفوسفات والنحاس والحجر الجيري والرمل الزجاجي، هذا بالإضافة إلى الثروات الأثرية والسياحية والتي أشبه ما تكون بمتحف طبيعي للحضارة والثقافة والسياحة، فعلى أرضها بنى الأنباط مدينة البتراء الوردية التي تعتبر أهم مناطق الجذب السياحي في الأردن.

## التضاريس والمناخ:

تتميز محافظة معان بتنوع التضاريس وينقسم السطح الطبيعي إلى وحدتين طبيعيتين هما:-  
١- الصحراء : وتشكل ما يقارب (٩٥%) من مجموع مساحة المحافظة .  
٢- الجبال : (وهي تعرف بسلسلة جبال الشراه) وتشمل هذه المنطقة القسم الغربي من المحافظة وتشكل جبال الشوبك والبتراء مركزها الرئيسي، ويصل إرتفاع بعضها (١٧٠٠)م عن سطح البحر .

يسود المناخ الصحراوي في المناطق الشرقية بينما يسود مناخ إقليم البحر الأبيض المتوسط في المرتفعات الغربية، ويبلغ معدل درجات الحرارة في الصيف حوالي (٣٦) درجة مئوية في المناطق الصحراوية، و(٢٩) درجة مئوية في المناطق الجبلية في حين يكون معدل درجات الحرارة في أشهر الشتاء (٢) درجة مئوية في المناطق الصحراوية و (٤) درجة مئوية في المرتفعات الجبلية ويتراوح معدل هطول الأمطار (٥٠) ملم في المناطق الصحراوية وما بين (٥٠٠ - ٧٥٠)ملم في مناطق جبال الشراه الغربية .

## الموقع والمساحة:

تقع محافظة معان جنوب المملكة، وتمتد من حدود محافظة العاصمة شمالاً وحتى الحدود السعودية-الأردنية جنوباً، ومن حدود وادي عربة (محافظة العقبة) غرباً إلى الحدود السعودية-الأردنية شرقاً.

تبعد عن العاصمة عمان حوالي (٢١٠) كم وتبلغ مساحة المحافظة (٣٢٨٣٢) كم٢ أي ما يعادل (٣٠%) من المساحة الإجمالية للمملكة .

## الواقع السكاني والكثافة السكانية:

يمثل سكان محافظة معان ما نسبته (٢%) من سكان المملكة بواقع (١٠٨٨٠٠) حسب تقديرات دائرة الإحصاءات العامة عام ٢٠٠٦م، وهي بذلك المحافظة الأوسع مساحة والأقل سكاناً مقارنة بمساحتها حيث بلغت الكثافة السكانية في محافظة معان حسب التقدير العام للسكان عام ٢٠٠٦ (٣.٣) شخص/كم<sup>٢</sup> ويشكل سكان محافظة معان حوالي (٢٠.٥%) من سكان إقليم الجنوب بمحافظاته الأربعة (الكرك والطفيلة ومعان والعقبة). وقد دلت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام ٢٠٠٦ على أن متوسط حجم الأسرة في محافظة معان (٦.٦) فرداً، وسجلت معدلات الأمية (٢٨.١) موزعة إلى (١٩.٦%) لدى الذكور (٣٩.١%) لدى الإناث. ويلاحظ من المعطيات السابقة أن أهم خصائص ومحددات الوضع السكاني في المحافظة هي:-

- انخفاض الكثافة السكانية في محافظة معان إذ تشكل النسبة الأقل على مستوى المملكة .
- توزيع السكان داخل المحافظة محدود في مناطق قليلة.
- الخلل الديمغرافي بين توزيع السكان وتوزيع الموارد.

### الجدول رقم (١)

التوزيع السكاني حسب الجنس واللواء والكثافة السكانية في محافظة معان

معدل الكثافة السكانية فرد/كم <sup>٢</sup>	النسبة %	المساحة كم <sup>٢</sup>	النسبة من المحافظة %	عدد السكان (نسمة)		اللواء
				ذكور	إناث	
١.٨	٩٦.٨	٣١٦٨١.٢	٥٤	٢٧٧٨٠	٣١١١٠	قصبية معان
١٩٦	٠.٥	١٣٩.٩١	٢٥	١٣٣٦٠	١٤١٦٠	البتراء
٣٣	١	٣٨٣.٠٤	١٢	٦١٢٠	٦٦٨٠	الشوبك
١٨.١	١.٧	٥٢٧.٥٩	٩	٤٥٤٠	٥٠٥٠	الحسينية
٣.٣	١٠٠	٣٢٧٣١.٧٤	١٠٠	١٠٨٨٠٠		المجموع

المصدر :- دائرة الإحصاءات العامة، ٢٠٠٦.

## التقسيمات الإدارية:

في سنة ١٩٩٤م تم فصل لواء العقبة والمراكز الإدارية التابعة له عن محافظة معان وتم ترفيعه إلى محافظة وأصبحت معان تتألف من الأولوية التالية :-

أولاً : لواء قصبية معان .

ٲانيا : لواء البتراء.  
ٲالثا : لواء الشوبك.  
رابعاً : لواء الحسينية .

## الخارطة رقم (١)

خارطة محافظة معان حسب الألوية والقرى



## أبرز المشاريع الرأسمالية لمحافظة معان

(بالآلاف دينار)

الرقم	اسم المشروع	الجهة المنفذة	مخصصات ٢٠٠٨	نسبة الإنفاق %	نسبة الإنجاز %	الملاحظات
	مجموع المشاريع الرأسمالية للمحافظة منها المشاريع التالية		٣٨٢٩٥.٢	٩٥.٥		المشروع يسير حسب المخطط له.
١.	حزمة مشاريع وزارة الصحة وتشمل إنشاء وتوسعة المراكز الصحية.	وزارة الصحة	١٩٨	٩٩	٨٥	المشروع يسير حسب المخطط له.
٢.	الفعاليات والأنشطة الثقافية والشبابية.	وزارة الثقافة	١٨	٩٦.٨	٨٥	-
٣.	إنشاء مبنى متصرفية لواء الشوبك.	وزارة الداخلية	١٥٠	٥٦.٢	٢٢	من المتوقع أن ينتهي المشروع في شهر آب/٢٠٠٩.
٤.	البنية التحتية لمنطقة معان الاقتصادية التنموية.	وزارة المالية	٢٤٠٠٠	١٠٠	٣٥	تم الانتهاء من عمليات الحفر لإقامة المجمع السكني.
٥.	ترميم موقع أذرح.	دائرة الآثار	١٠٠	٨٨.٨	٦٠	-
٦.	ترميم قلعة الشوبك.	دائرة الآثار	٨٠	٨٧.٧	١٠٠	-
٧.	إنشاء طريق جامعة الحسين بن طلال بما فيها تحويلة معان.	وزارة الأشغال	١٥٠٠	١٠٠	٩٧	المشروع في المراحل النهائية.
٨.	سد الوحيدي.	سلطة وادي الأردن	٧٠	٩٩.٧	٥	-
٩.	توسعة وتحديث مستشفى معان.	وزارة الصحة	١٥٠	٧٥.٨	٥	دراسات وتصاميم.
١٠.	توسعة وتحديث قسم الطوارئ والإسعاف في مستشفى معان.	وزارة الصحة	١٥٥	٥٢.٦	٥	تم طرح العطاء في الصحف المحلية والدراسات والتصاميم جاهزة.
١١.	إسكان الأسر الفقيرة.	وزارة الأشغال	٩٢٣	١٠٠	١٠٠	-
١٢.	تأهيل مشروع الجفر	وزارة	٩٠	٤٦.٦	٩٥	-



				الزراعة	الزراعي.
--	--	--	--	---------	----------

(بالآلف دينار)

الرقم	اسم المشروع	الجهة المنفذة	مخصصات ٢٠٠٨	نسبة الإنفاق %	نسبة الإنجاز %	الملاحظات
١٣.	إدارة المـود الطـبيـة لمحافظتي الكرك والطفيلة المرحلة الثاني.	وزارة الزراعة	١١٨	٨٩.٧	٤٠	-
١٤.	الحزام الأخضر.	وزارة الزراعة	١٩.٨	٩٦.٣	٥٠	-
١٥.	مركز معان الثقافي.	وزارة الثقافة	١٧٦٠	٦٠.٦	٣٥	من المتوقع الانتهاء من المشروع في نهاية عام ٢٠٠٩.

## خلاصة التقييم لأهم المشاريع التنموية والرأسمالية لمحافظة معان

مخصصات النفقات الرأسمالية للمشاريع التنموية في قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٠٨  
 قدرت مخصصات المشاريع الرأسمالية لمحافظة معان لعام ٢٠٠٨ بمبلغ (٣٨٢٩٥.٢) ألف دينار موزعة حسب الفصول للوزارات والدوائر الحكومية حيث تم إنفاق (٣٦٥٦٠.٨) ألف دينار بنسبة (٩٥.٥%) حتى تاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١ وهي ضمن النسب المستهدفة وتعتبر مرتفعة بالمقارنة مع بعض المحافظات الأخرى، ويعزى سبب هذا الإرتفاع لمشروع البنية التحتية لمنطقة معان الإقتصادية التنموية والذي يشكل ما نسبته (٦٢.٧%) من مخصصات المحافظة حيث رصد لهذا المشروع مبلغ (٢٤) مليون دينار في موازنة عام ٢٠٠٨ وقد تم إنفاق كامل المبلغ حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ مشكلاً ما نسبته (٦٥.٦%) من مجموع إنفاق المحافظة .


(بالآلف دينار)

البيان	مقدر ٢٠٠٨	الانفاق حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١	نسبة الإنفاق الفعلي %
المشاريع الرأسمالية	٣٨٢٩٥.٢	٣٦٥٦٠.٨	٩٥.٥

المصدر: دائرة الموازنة العامة، ٢٠٠٨.

الشكل رقم (١)


مقارنة الاتفاق الفعلي للمشاريع الرأسمالية حسب القطاعات  
لمحافظة معان

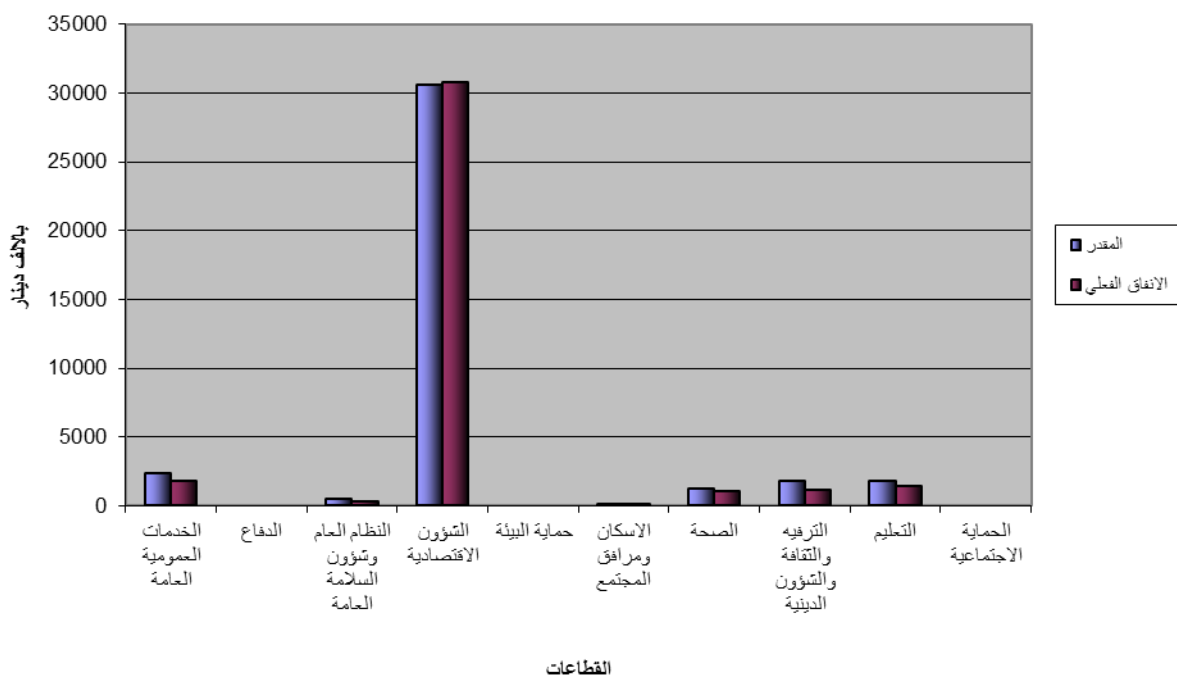

ويشير توزيع مخصصات المحافظة حسب القطاعات الوظيفية إلى أن قطاع الشؤون الاقتصادية إستأثر على ما نسبته (٨٠%) من إجمالي مخصصات محافظة معان لعام ٢٠٠٨ وذلك من أجل تنمية المحافظة إقتصادياً والمساهمة في تخفيض معدلات البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة من مشاريع البنية التحتية ومشاريع تعزيز الإنتاجية وتحفيز الإستثمارات المحلية، وتلاه في المرتبة الثانية قطاع الخدمات العمومية والذي حاز على ما نسبته (٦.١%) من إجمالي مخصصات المحافظة وتلاه قطاع الترفيه والثقافة والشؤون الدينية كما هو واضح في الشكل رقم (٢).

الشكل رقم (٢)

#### التوزيع القطاعي للمشاريع الرأسمالية لمحافظة معان

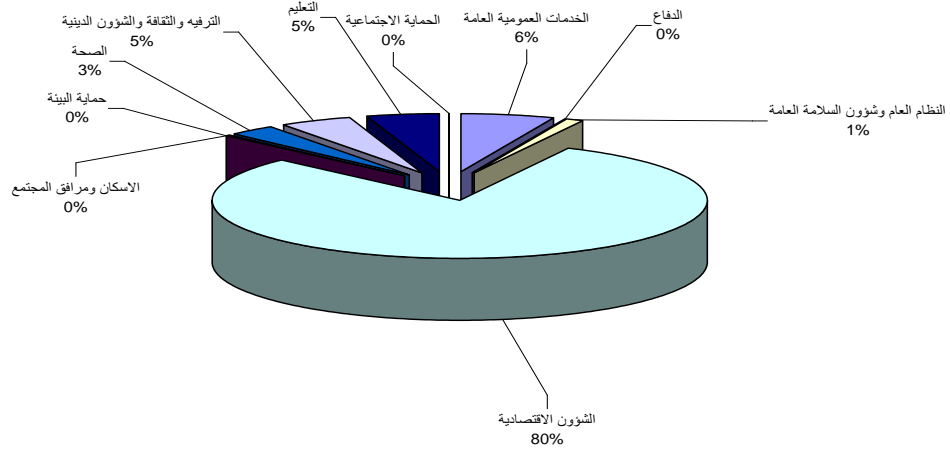

■ الخدمات العمومية العامة ■ الدفاع ■ النظام العام وشؤون السلامة العامة ■ الشؤون الاقتصادية ■ حماية البيئة ■ الاسكان ومرافق المجتمع ■ الصحة ■ الترفيه والثقافة والشؤون الدينية ■ التعليم ■ الحماية الاجتماعية

وفي ما يلي تحليل موجز لأهم مخصصات المشاريع الرأسمالية حسب الفصول:-

#### الإشغال العامة والإسكان :-

تم رصد مبلغ (٦٨٥٧.٢) ألف دينار مشكلة ما نسبته (١٧.٩%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة وتم إنفاق (٦٣٥٢.٩) ألف دينار أي ما نسبته (٩٢.٧%) من المخصصات المرصودة لوزارة الأشغال العامة والإسكان في المحافظة حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١، وهي نسبة ضمن المستوى المستهدف.

#### التربية والتعليم :-

تم رصد مبلغ (١٤٥١.٨) ألف دينار أي ما نسبته (٣.٨%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمحافظة، وبلغ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ (١٢٥٦) ألف دينار أي ما نسبته (٨٦.٥%) من المخصصات المرصودة لوزارة التربية والتعليم في المحافظة، وتعتبر هذه النسبة ضمن المستوى المقبول.

#### الصحة :-

بلغت المخصصات المرصودة لوزارة الصحة في المحافظة (١٢٠١.٩) ألف دينار مشكلة ما نسبته (٣.١%) من إجمالي المخصصات للمشاريع الرأسمالية في المحافظة، كما بلغ الإنفاق الفعلي لغاية ٢٠٠٨/١٢/٣١ من هذا العام (١٠٨٦.٦) ألف دينار أي ما نسبته (٩٠.٤%) من مخصصات وزارة الصحة في المحافظة .

### الزراعة :-

بلغت المخصصات المرصودة لوزارة الزراعة في المحافظة (١٢٤١.١) ألف دينار مشكلة ما نسبته (٣.٢%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمشاريع الرأسمالية في المحافظة تم إنفاق (١٤١٢.٥) ألف دينار أي ما نسبته (١١٣.٨%) من المخصصات المرصودة لهذا القطاع حتى نهاية ٢٠٠٨/١٢/٣١ .

### السياحة والآثار :-

بلغت المخصصات المرصودة لمشاريع السياحة والآثار (٥٢٧.١) ألف دينار مشكلة ما نسبته (١.٤%) من إجمالي المخصصات المرصودة للمشاريع الرأسمالية في المحافظة تم إنفاق (٥١١) ألف دينار أي ما نسبته (٩٦.٩%) من المخصصات المرصودة لوزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة في المحافظة حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ .

وفيما يلي بطاقة وصف لأهم المشاريع التي تم تقييمها:-

بالآلاف دينار



١ - حزمة مشاريع وزارة الصحة وتشمل إنشاء وتوسعة المراكز الصحية	
١٢٦٤	الكلفة الكلية :
٢٤ شهراً	مدة التنفيذ:
١٩٨	مخصصات عام ٢٠٠٨ :
١٩٥.٩	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ :
%٩٩	نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨ :
%٨٥	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨ :
- مركز صحي دلاغة جاهز للطرح	سير العمل في المشروع:
- مركز صحي المدورة تم الطرح والإحالة بمساحة ٤٨٠ متر ولم تتم المباشرة بعد	
- مركز صحي مضبيع تم إنشاؤه بمساحة ١٥٠ متر مربع .	
- توسعة مركز صحي الجفر بمساحة ٤٠٠-٣٥٠ متر .	
- مركز صحي أوهيده (استكمال) : تم الإستلام والمبنى قيد التجهيز	
- مركز صحي المقارعية (استكمال) : استلام والمبنى قيد التجهيز والتأثيث	
- إنشاء مبنى مركز صحي معان الشامل بمساحة ٩٠٠ متر . قيد الإنشاء %٤٠	الأوامر التغييرية :
١- مركز صحي أوهيده %١٠٠	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:
٢- مركز صحي المقارعية %١٠٠	
٣- مبنى مركز صحي معان الشامل %٤٠	
٤- مركز صحي مضبيع %١٠٠	
المشاريع تسير حسب ما هو مخطط له.	تقييم المشروع :
هذه المشاريع تخدم سكان التجمعات السكانية في المحافظة حسب موقع كل مركز	ملاحظات :

بالآلاف دينار

٢ - مشروع الفعاليات والأنشطة الثقافية والشبابية	
٢٠	الكلفة الكلية
١٠ شهور	مدة التنفيذ
١٨	مخصصات عام ٢٠٠٨
١٧.٤	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
%٩٦.٨	نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨
%٨٥	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨ :
حسب الخطة المعدة مسبقاً	سير العمل في المشروع:
لا يوجد	الأوامر التغييرية

نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع	٨٥% المشروع يسير حسب ما هو مخطط له
ملاحظات:	-

### بالآلف دينار

٣- مشروع إنشاء مبنى متصرفية لواء الشويك	
<p>تشرين اول ٢٠٠٨</p> 	<p>كانون اول ٢٠٠٨</p> 
<p>٥٢٢ ١٢ شهراً ١٥٠ ٨٤.٢ ٥٦.٢% ٢٢%</p>	<p>الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الانفاق لغاية ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:</p>
<p>المشروع يسير حسب البرنامج المعد وتبلغ مساحة البناء ٤٠٠٠م مؤلف من طابقين</p> <p>- ٢٢%</p> <p>يواجه المشروع مشكلة في توفر الأيدي العاملة ومن المتوقع أن ينتهي في شهر ٢٠٠٩/٨ وينفذ من قبل شركة القيسي والخصاونة</p>	<p>سير العمل في المشروع</p> <p>الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع</p>
<p>المبنى يقع بجانب المبنى القديم</p>	<p>ملاحظات</p>

٤- مشروع البنية التحتية لمنطقة معان الاقتصادية التنموية

أيار تشرين أول ٢٠٠٨	٤٤٠٠٠	الكلفة الكلية
 <p>٢٠٠٨</p>	<p>٤٤ شهراً ٢٤٠٠٠ ٢٤٠٠٠ %١٠٠ %٢٥</p>	<p>مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الاتفاق لغاية ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨: سير العمل في المشروع</p>
<p>✚ تم إنشاء شركة تطوير معان المساهمة الخاصة وذلك بمشاركة ما بين شركة الجنوب للإعمار والتطوير ومؤسسة المدن الصناعية وجامعة الحسين بن طلال لتكون الذراع الإستثماري الخاص بتنمية وتطوير منطقة معان التنموية الخاصة.</p> <p>✚ مكونات المدينة التنموية :</p> <p>١- المنطقة السكنية : موقعها مقابل جامعة الحسين بن طلال وبمساحة ١٠٠٠ دونم ومن المتوقع أن يسكنها ١٣٠٠٠ نسمة.</p> <p>٢- مركز تدريب مهني : وموقعه مركز تدريب مهني معان القائم حالياً ، وبمساحة ٥٠ دونم وسوف يتم تطوير البناء القائم وإضافة سكن للمتدربين ومبنى خدمات .</p> <p>٣- مدينة الحجاج : تقع على بعد ٣ كم من تقاطع الجفر باتجاه المدورة وبمساحة ٢٠٠ دونم .</p> <p>٤- المدينة الصناعية : وذلك لتوفير بيئة صناعية مزودة بكافة البنى التحتية من شبكة طرق وكهرباء وإتصالات ومحطة تنقية والخدمات اللازمة لإقامة مختلف أنواع الصناعات وهي بمساحة (٢٥٠٠) دونم وتم توسعتها لتصبح (٧٥٠٠) دونم وذلك بعد إنشاء المنطقة التنموية الخاصة في معان حيث أن المساحة المطورة منها (٧٠٠) دونم :</p> <p>- يوجد في المدينة مباني إدارية وخدمات مساندة بمساحة (٢١٤٠)م<sup>٢</sup> .</p> <p>- مباني صناعية جاهزة بمساحة (٢٢٦٠٠)م<sup>٢</sup>.</p>		

نسبة الانجاز تصل ٦٠%.	
- ٣٥% الدراسات والتصاميم والمخططات جاهزة للمكونات الاخرى للمشروع باستثناء المدينة الصناعية حيث تصل نسبة الانجاز لجميع المرافق ما نسبته ١٠٠% للمساحة المقررة حالياً وسوف يتم التوسع فيما بعد ، كما وأنه تم البدء بعملية الحفر وهي شبه منتهية لإقامة المجمع السكني مقابل جامعة الحسين بن طلال.	الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية : تقييم المشروع

بالآلف دينار

٥- مشروع ترميم موقع ادرح		٣٠٠ ٧ شهور ١٠٠	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨
تشرين أول ٢٠٠٨	كانون أول ٢٠٠٨		
			
		٨٨.٨ %٨٨.٨ %٦٠	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨ : سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع
العمل جارٍ وهو عبارة عن ترميم أسوار وإزالة طمم لا يوجد %٦٠ المشروع يسير حسب المخطط له.			

بالآلف دينار

٦- مشروع ترميم قلعة الشوبك		٢٥٠ ١٢ شهراً ٨٠ ٧٠.٢	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
أيار ٢٠٠٨	تشرين أول ٢٠٠٨		
			



	<p>٨٧.٧% ١٠٠%</p>	<p>نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:</p>
<p>العمل جارٍ في المشروع ويسير حسب المخطط له وهو عبارة عن ترميم وعمل جدران وإزالة طمم ويعمل في المشروع ١٢ عامل ومشرف لا يوجد</p>	<p>١٠٠%</p>	<p>سير العمل في المشروع الأوامر التغييرية نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع</p>
<p>المشروع يسير حسب المخطط</p>	<p>المشروع يتم بالتعاون مع الخبراء الإيطاليين الذين يعملون في نفس الموقع</p>	<p>ملاحظات</p>

بالألف دينار

٧- مشروع انشاء طريق جامعة الحسين بن طلال بما فيها تحويلة معان

أيار ٢٠٠٨	كاتبون أول ٢٠٠٨	٥٦٤٧	الكلفة الكلية
		٢٢ شهراً	مدة التنفيذ
		١٥٠٠	مخصصات عام ٢٠٠٨
		١٥٠٠	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
		%١٠٠	نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨
		%٨٥	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
المشروع قيد التنفيذ وفي المراحل النهائية من أعمال الكنדרين والإنارة			سير العمل في المشروع
-			الأوامر التغييرية
%٩٧			نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:
المشروع يسير حسب المخطط			تقييم المشروع
-			ملاحظات :


بالألف دينار

٨- مشروع سد الوحيدي

		٣١١٠	الكلفة الكلية
		٣٠ شهراً	مدة التنفيذ
		٧٠	مخصصات عام ٢٠٠٨
		٦٩.٨	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
		%٩٩.٧	نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨
		%٣	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
المشروع في مرحلة الدراسات وإعداد التصاميم وسيتم طرح عطاء الانشاء مطلع العام القادم.			سير العمل في المشروع .
-			الأوامر التغييرية .
%٥			نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:
ما زال المشروع بإنتظار مرحلة الطرح			تقييم المشروع .
-			ملاحظات .

بالآلف دينار

### ٩ - مشروع توسعة وتحديث مستشفى معان

تشرين أول ٢٠٠٨	١٧٥٠	الكلفة الكلية
	٣٠ شهراً	مدة التنفيذ
	١٥٠	مخصصات عام ٢٠٠٨
	١١٣.٦	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
	٧٥.٨%	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨
	١٠٠%	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
تم إعداد المخططات والتصاميم ووثائق العطاء لهذا المشروع والعطاء قيد الطرح والإحالة .	-	سير العمل في المشروع.
	٥%	الأوامر التغييرية:
في مرحلة الطرح المشروع يسيير حسب المستوى المخطط له.	-	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية::
	-	تقييم المشروع .
	-	ملاحظات


بالآلف دينار

### ١٠ - مشروع توسعة وتحديث قسم الطوارئ والإسعاف في مستشفى معان

تشرين أول ٢٠٠٨	٤٥٠	الكلفة الكلية
	٢٤ شهراً	مدة التنفيذ
	١٥٥	مخصصات عام ٢٠٠٨
	٨١.٥	الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
	٥٢.٦%	نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨
	١٠٠%	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
تم إعداد المخططات والتصاميم ووثائق العطاء لهذا المشروع وتم طرح العطاء في الصحف المحلية وكانت التكلفة (٧٥) ألف	-	سير العمل في المشروع .
	٥%	الأوامر التغييرية .
	-	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:

تقييم المشروع .	في مرحلة الطرح المشروع يسير حسب المستوى المخطط له.
ملاحظات .	-

### بالآلاف دينار

<b>١١ - مشروع إسكان الأسر الفقيرة (معان ، الحسينية ، الجفر ، المدورة ، أيل ، المحمية ، دلاغة والبتراء)</b>		
أيار ٢٠٠٨ 	تشرين أول ٢٠٠٨ ٢٢٥٠٠ ١٢ شهراً ٩٢٣ ٩٢٣ %١٠٠ %١٠٠	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
الحسينية والجفر والمدورة وأيل والمحمية جاهزة بنسبة %١٠٠ ومعان %٩٠ والبتراء ودلاغة %٨٥ لا يوجد %١٠٠ المشروع يسير حسب المخطط		سير العمل في المشروع . الأوامر التغييرية . نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية: تقييم المشروع .
- تم اجراء مناقلة		ملاحظات .

### بالآلاف دينار

<b>١٢ - تأهيل مشروع الجفر الزراعي</b>	
٦٥٠ ٢٤ شهراً ٩٠ ٤٢ %٤٦.٦ %٧٥	الكلفة الكلية مدة التنفيذ مخصصات عام ٢٠٠٨ الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨ نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:

<p>يهدف المشروع إلى توطين البادية من خلال وحدات زراعية يملكها مزارعين من أبناء المنطقة حيث توجد (٤٢) وحدة زراعية مزروعة بأشجار الزيتون والبرسيم كما يوجد (٥) آبار للري تم إستصلاح (٣) منها لاغرض الري كما ويتم عمل ورشات للمزارعين والمشغلين للآبار بإستمرار.</p> <p>-</p> <p>٩٥% المشروع يسير حسب المخطط</p>	<p>سير العمل في المشروع .</p> <p>الأوامر التغييرية .</p> <p>نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:</p> <p>تقييم المشروع .</p>
-	ملاحظات .

### بالألف دينار

١٣ - مشروع إدارة المواد الطبيعية لمحافظة الكرك والطفيلة - المرحلة الثانية	
<p>٢٩٩٠٠</p> <p>مستمر</p> <p>١١٨</p> <p>١٠٥.٨</p> <p>٨٩.٧%</p> <p>١٠%</p> <p>المشروع ينفذ مع جهات مانحة (إيفاد) بهدف إستصلاح الأراضي الزراعية التي يملكها مزارعون وتقع خارج حدود التنظيم ويقومون بزراعة الأشجار المثمرة التي تتناسب مع طبيعة المنطقة بالإضافة إلى نشاط تنمية المرأة الريفية عن طريق مؤسسة الإقراض الزراعي ويشترط في هذه المشاريع ان تكون غير مشمولة بمشاريع أخرى تابعة لوزارة الزراعة .</p> <p>-</p> <p>٤٠%</p> <p>هناك بطء في الإنجاز بسبب عدم توفر الكفاءات مما يضطرهم إلى إستقدام لجان من الكرك</p>	<p>الكلفة الكلية</p> <p>مدة التنفيذ</p> <p>مخصصات عام ٢٠٠٨</p> <p>الإنفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١</p> <p>نسبة الإنفاق من المخصص ٢٠٠٨</p> <p>نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:</p> <p>سير العمل في المشروع .</p> <p>الأوامر التغييرية .</p> <p>نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:</p> <p>تقييم المشروع .</p>
<p>يتم تقديم الدعم على أساس مساحة الأرض المزروعة بالدونم</p>	ملاحظات .

وعلى مساحة السلاسل بالمتنر

بالآلف دينار

١٤ - مشروع الحزام الأخضر	
٣٥	الكلفة الكلية
مستمر	مدة التنفيذ
١٩.٨	مخصصات عام ٢٠٠٨
١٩	الإنتفاق الفعلي حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١
%٩٦.٢	نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨
%٣٥	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
يقع المشروع في المنطقة الغربية (الهاشمية ، الحسينية) ويهدف إلى حماية المنطقة من الأتربة والغبار والمحافظة على البيئة من خلال زراعته بالأشجار الحرجية	سير العمل في المشروع .
-	الأوامر التغييرية .
%٥٠	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:
المشروع يسير حسب المخطط	تقييم المشروع .
-	ملاحظات .

بالآلف دينار

١٥ - مشروع مركز ثقافي معان	
٥٠٠٠	الكلفة الكلية
٢٤ شهراً	مدة التنفيذ
١٧٦٠	مخصصات عام ٢٠٠٨
١٠٦٦.٧	الانفاق لغاية ٢٠٠٨/١٢/٣١
%٦٠.٦	نسبة الإنتفاق من المخصص ٢٠٠٨
%٢٠	نسبة الانجاز لعام ٢٠٠٨:
المشروع يسير حسب البرنامج المعد وتبلغ مساحة البناء ٥١٨٩ متر مربع ومن المتوقع أن يتم زيادة مساحة البناء لتصبح ٦٠٠٠ متر مربع وهو مؤلف من ثلاثة طوابق ويتم تنفيذه من قبل مجموعة الخمس للهندسة والإنشاء لا توجد أوامر تغييرية لغاية تاريخه وقد تظهر لاحقاً عند التوسعة	سير العمل في المشروع .
%٣٥	الأوامر التغييرية .
المشروع يسير بشكل جيد وحسب المخطط	نسبة الانجاز مقارنة بالكلفة الاجمالية:
تبلغ قيمة العطاء عند الإحالة (٥) مليون دينار	تقييم المشروع .
من المتوقع الإنتهاء من المشروع في نهاية عام ٢٠٠٩	ملاحظات .

## مطالب واحتياجات محافظة معان

- ١- وضع المخصصات اللازمة لبناء المدارس الحكومية في مختلف مناطق المحافظة للاستغناء عن المدارس المستأجرة والتي لاتصلح كمدارس.
- ٢- العمل على إيجاد آلية مناسبة لحل مشكلة كلية الشوبك وإعادة تأهيلها حيث بلغ عدد الطلاب فيها مساوي لعدد الموظفين .
- ٣- دعم جامعة الحسين بن طلال لتمكينها من أكمال المباني والمستلزمات للجامعة.
- ٤- تحويل مدرسة ايل الثانويه المهنيه الى كلية جامعية تتبع لجامعة الحسين بن طلال.
- ٥- إنشاء مستشفى عسكري في موقع متوسط من التجمعات السكانية.
- ٦- ترفيع المركز الصحي في بلدة الحسينية إلى مركز صحي شامل ورفده بالكوادر والأجهزة والمعدات الطبية اللازمة نظراً لوقوعها على الطريق الصحراوي.
- ٧- تحويل مركز صحي ايل الاولي الى شامل.
- ٨- توفير جهاز رنين مغناطيسي في مستشفى جلالة الملكة رانيا العبدالله.
- ٩- توفير وحدة تشخيص امراض القلب في مستشفى جلالة الملكة رانيا العبدالله.
- ١٠- تطوير المركز الحدودي في منطقة المدورة وذلك بإنشاء المباني اللازمة والمساحات والمرافق الأخرى الضرورية.
- ١١- تكملة فتح دوائر الخدمات في لواء الحسينيه وخاصة مكتب للاشغال العامه.
- ١٢- فتح مسربين لطريق وادي موسى - معان.
- ١٣- المساعدة في بناء جدران اسمنتية لمجرى سيل معان المار من وسط المدينة لتجنب حدوث كوارث سبق ان حصل بعض منها في مواسم سابقه وبناء سد في نهاية الوادي.
- ١٤- دعم المزارعين بما فيهم مربى الثروة الحيوانية بإعفائهم من الفوائد المستحقة عليهم وجدولة قروضهم بشكل ميسر.
- ١٥- تنمية المراعي في المحافظة وخاصة في منطقة باير والمريغه وأي منطقة مناسبة.
- ١٦- استغلال مشروع اوهيده الزراعي لغايات الزراعات العلفيه والحبوب .
- ١٧- رفد مديرية زراعة لواء البتراء بآليات الحراثة والكوادر الفنيه اللازمه.
- ١٨- العمل على إيجاد الحل الأمثل لإدارة وتطوير منطقة البتراء السياحية بما يكفل عدم تعدد الصلاحيات وتطوير المنطقة واستثمارها في جذب المزيد من الأفواج السياحية وخاصة أنها إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة في العالم.
- ١٩- إنشاء قصر للمؤتمرات في لواء البتراء.
- ٢٠- الإسراع بتنفيذ مشروع سد الوحيد في قضاء اذرح واقامة السدود الترابيه في مختلف مناطق المحافظة لاستغلالها في ري المواشي.
- ٢١- تفعيل مكتب مياه الحسينيه وتزويده بالموظفين والفنين .
- ٢٢- بناء خزان للمياه لخدمة كافة تجمعات اللواء.
- ٢٣- دعم الأندية والمراكز الشبابية في المحافظة لتمكينها من القيام بنشاطاتها المختلفة
- ٢٤- تطوير مجمع سمو الأميرة هيا ليصبح مدينة رياضية متكاملة تخدم أبناء المحافظة.



- ٢٥- دعم الجمعيات الخيرية والتعاونية لتمكينها من القيام بالمهام التي أنشئت من أجلها.
- ٢٦- العمل على استغلال المياه المستخدمة في غسل مادة الفوسفات في مناجم الشيديه والمياه العادمة المستصلحه في محطة تنقية معان والتي تقدر بعشرات الالاف من الامتار المكعبه في زراعة الاعلاف والنباتات المفيده وحتى يتم التكامل في هذا الموضوع يطلب من وزارة التخطيط (الامان الاجتماعي وتعزيز الانتاجيه) في تاسيس مزرعة ابقار والتي سيتم توفير الاعلاف لها حتى يتم تشغيل مصنع الالبان المعطل في منطقة قرين منذ خمسة سنوات، ويمكن ان تتولى الجمعيات التعاونيه ذلك.
- ٢٧- حل مشكلة الواجهات العشائرية وإيجاد طريقة عادله لتفويض أراضي الدولة على المواطنين تحاشياً لحدوث مشاكل وخاصة الواجهه الغربيه للوائي الشوبك والبتراء.
- ٢٨- أظهار مشروع المنطقة التنموية في محافظة معان الى حيز التنفيذ بما فيها المدينه السكنيه مقابل جامعة الحسين وكذلك مدينة الحجاج الى حيز الوجود.
- ٢٩- إظهار مشروع الميناء البري في معان حيث الارض متوفره.
- ٣٠- إيجاد الحلول المناسبة لإعادة تشغيل مصنع الزجاج في مدينة معان لتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة والمملكة بشكل عام.
- ٣١- استثمار موقع مشروع مصنع السيارات (اللاندروفر) وخاصة إن المباني والهاجر والبنية التحتية جاهزة بنسبة (٧٠%).
- ٣٢- الاستمرار في اقامة مشاريع المكرمه الملكيه(اسكان الاسر الفقيرة) نظرا لوجود حاجه ماسة لذلك.
- ٣٣- إيجاد حل لمشكلة استغلال إسكان الفوسفات في مدينة معان والذي يشتمل على (١٠٠) وحدة سكنيه بالإضافة الى المرافق الاخرى وما زال غير مستغل منذ انشائه قبل (٨) سنوات.
